ALLEGATO 3

# CRONOPROGRAMMA FORNITURA MATERIALE ROTABILE LINEA C
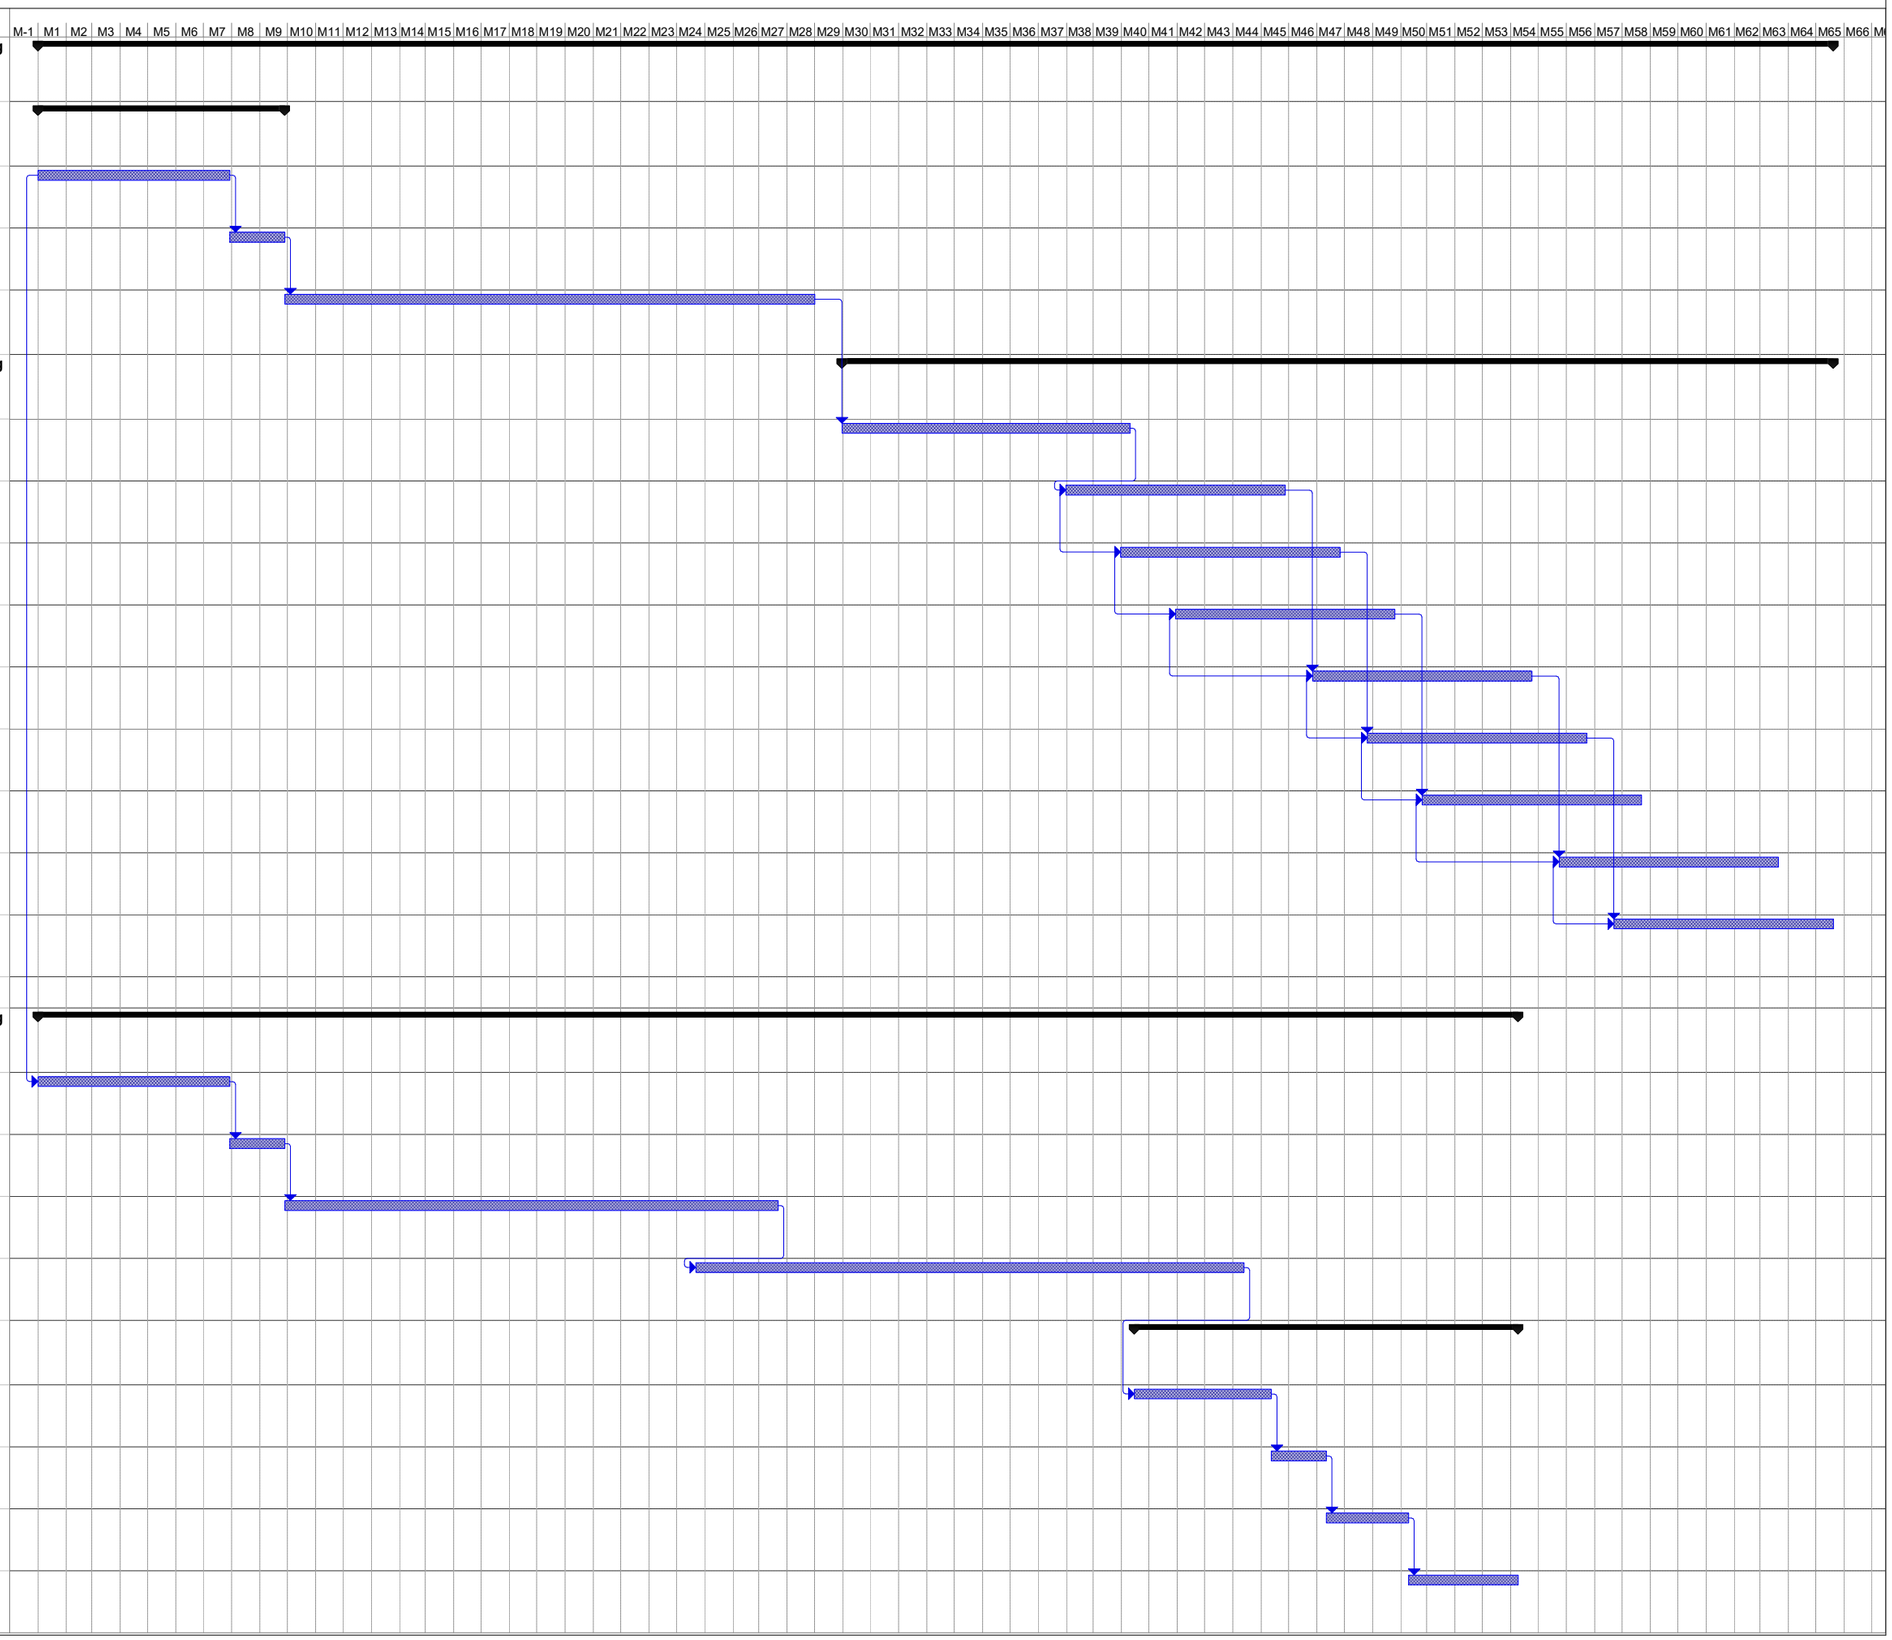
| ID | Nome attività | Durata |
|---|---|---|
| 1 | **FORNITURA MATERIALE ROTABILE** | **1965 g** |
| 2 | **Iter approvativo del progetto di variante** | **270 g** |
| 3 | Progetto esecutivo | 210 g |
| 4 | Approvazione progetto esecutivo (comprensivo di N.O.T. per la sicurezza ai sensi dell'art. 3 del DPR 753/1980) | 60 g |
| 5 | **Costruzione veicoli** | 580 g |
| 6 | **Prove in situ e collaudi** | **1085 g** |
| 7 | Test e collaudi veicoli 14 e 15 | 315 g |
| 8 | Test e collaudi veicoli 16 e 17 | 240 g |
| 9 | Test e collaudi veicoli 18 e 19 | 240 g |
| 10 | Test e collaudi veicoli 20 e 21 | 240 g |
| 11 | Test e collaudi veicoli 22 e 23 | 240 g |
| 12 | Test e collaudi veicoli 24 e 25 | 240 g |
| 13 | Test e collaudi veicoli 26 e 27 | 240 g |
| 14 | Test e collaudi veicoli 28 e 29 | 240 g |
| 15 | Test e collaudi veicolo 30 | 240 g |
| 16 | | |
| 17 | **Deposito Graniti - Realizzazione aree 17C e 17D** | **1620 g** |
| 18 | Progetto esecutivo | 210 g |
| 19 | Approvazione progetto esecutivo | 60 g |
| 20 | Opere civili | 540 g |
| 21 | Impianti | 600 g |
| 22 | **PROVE** | **420 g** |
| 23 | Prove di sottosistema e di interfaccia impianti | 150 g |
| 24 | Prove di tensione ATC | 60 g |
| 25 | Prove di integrazione tra impianti (MIS ATC e prove integrate impianti) | 90 g |
| 26 | Prove preventive funzionali (di Sistema) e prove con Enti certificatori | 120 g |
