PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

ID	WBS	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Predecessori
1	**0**	**Lavori di completamento della diga di Pietrarossa (912gg)**		**ven 21/07/23**	**sab 21/03/26**	
2	0.1	Consegna Lavori Parziale	0 g	**ven 21/07/23**	**ven 21/07/23**	
3	0.2	Completamento Consegna Lavori	0 g	**gio 21/09/23**	**gio 21/09/23**	2
4	0.3	Attivazione Piattaforma M.G.O.	0 g	**ven 21/07/23**	**ven 21/07/23**	2
5	M1a	**Milestone 1 - Completamento strade (fase 1)**	0 g	sab 30/11/24	sab 30/11/24	74
6	M2	**Milestone 2 - Completamento Gallerie di Accesso cunicolo esistente**	0 g	sab 29/11/25	sab 29/11/25	226
7	M3	**Milestone 3 - Completamento Interventi Messa in Sicurezza Versante sponda DX**	0 g	sab 06/09/25	sab 06/09/25	135
8	M4	**Milestone 4 - Completamento Adeguamento Sismico Opere Civili**	0 g	mer 17/09/25	mer 17/09/25	301;241;263;306;331;3
9	M5	**Milestone 5 - Completamento Casa di Guardia**	0 g	gio 14/11/24	gio 14/11/24	380
10	M6	**Milestone 6 - Completamento Corpo Diga**	0 g	mar 25/11/25	mar 25/11/25	151
11	M7	**Milestone 7 - Completamento Adeguamento Opere di presa in DX e SX idraulica**	0 g	sab 30/08/25	sab 30/08/25	354
12	M8	**Milestone 8 - Completamento Opere Elettromeccaniche**	0 g	sab 01/11/25	sab 01/11/25	404;264;309;336;367
13	M9	**Milestone 9 - Completamento Siatemazione Idraulica Alveo di Valle**	0 g	gio 11/09/25	gio 11/09/25	402
14	**1**	**Installazione e ripiegamento logistica di cantiere (SCHEDA 1)**	**294 g**	**lun 28/08/23**	**lun 17/06/24**	
15	**1.1**	**Installazione apprestamenti logistico-assistenziali /recinzioni, baracche, impianti provvisori)**	**102 g**	**lun 28/08/23**	**ven 08/12/23**	
16	**1.1.1**	**Sistemazione accesso cantiere ed area installazione uffici**	**15 g**	**mar 12/09/23**	**mer 27/09/23**	**4FI+10 g**
17	1.1.1.1	Messa in sicurezza della viabilità di accesso alla diga	2 g	lun 25/09/23	mer 27/09/23	4FI+62 g
18	1.1.1.2	Pulizia aree destinate alla logistica di cantiere (area installazione uffici)	2 g	mar 12/09/23	gio 14/09/23	4FI+53 g
19	1.1.2	Rilievi topografici	30 g	lun 28/08/23	mer 27/09/23	2FI+38 g
20	1.1.3	Realizzazione edificio uso ufficio/servizi principali	30 g	gio 19/10/23	sab 18/11/23	2FI+90 g;18
21	1.1.4	Realizzazione edifici uso officina, magazzino	20 g	sab 18/11/23	ven 08/12/23	20
22	1.1.5	Recinzioni area uffici	20 g	ven 03/11/23	gio 23/11/23	20II+15 g
23	1.2	Esecuzione piazzali e piste di cantiere	45 g	mer 27/09/23	sab 11/11/23	19
24	**1.3**	**Installazione impianti per preparazione miscele lato valle**	**150 g**	**ven 01/12/23**	**lun 29/04/24**	
25	1.3.1	Installazione impianto preparazione miscele di calcestruzzo e laboratorio	60 g	ven 01/12/23	mar 30/01/24	23FI+20 g
26	1.3.2	Installazione impianto preparazione miscele di iniezioni	30 g	sab 30/03/24	lun 29/04/24	29FI+15 g
27	1.5	- Installazioni di cantiere completate	0 g	mar 30/01/24	mar 30/01/24	21;22;25
28	**1.4**	**Studio dei materiali da costruzione**	**210 g**	**lun 20/11/23**	**lun 17/06/24**	
29	1.4.1	Studio miscele di calcestruzzo	45 g	mar 30/01/24	ven 15/03/24	25
30	1.4.2	Selezione, prove sui materiali ed approvazione	60 g	lun 20/11/23	ven 19/01/24	3FI+60 g
31	1.4.3	Corpo Diga - Indagini e prove sui materiali	120 g	mer 20/12/23	gio 18/04/24	3FI+90 g
32	1.4.4	Corpo Diga - Progetto di dettaglio lavori di completamento ed approvazione	45 g	ven 03/05/24	lun 17/06/24	31FI+15 g
33	**2**	**Sistemazioni stradali (SCHEDA 2)**	**772 g**	**gio 19/10/23**	**sab 29/11/25**	
34	**2.1**	**SP 103 (pk.0+000 - 4+360)**	**655 g**	**gio 19/10/23**	**lun 04/08/25**	
35	2.1.1	Adeguamento fondazione stradale e scavo canalette	90 g	gio 19/10/23	mer 17/01/24	19;2FI+90 g
36	2.1.2	Base in misto granulare	135 g	ven 19/01/24	dom 02/06/24	35;30
37	2.1.3	Manufatto M1 - pk.0+150	30 g	ven 15/03/24	dom 14/04/24	29
38	2.1.4	Manufatto M2 - pk.0+400	30 g	ven 22/03/24	dom 21/04/24	37II+7 g
39	2.1.5	Manufatto M3 - pk.1+310	30 g	ven 29/03/24	dom 28/04/24	38II+7 g
40	2.1.6	Manufatto M4 - pk.1+820	30 g	dom 28/04/24	mar 28/05/24	39
41	2.1.7	Manufatto M5 - pk.2+430	30 g	dom 05/05/24	mar 04/06/24	40II+7 g
42	2.1.8	Manufatto M6 - pk.2+800	30 g	dom 12/05/24	mar 11/06/24	41II+7 g
43	2.1.9	Manufatto M8 - pk.3+360	30 g	mar 28/05/24	gio 27/06/24	40
44	2.1.10	Muro di contenimento - Tratto 1	45 g	mar 11/06/24	ven 26/07/24	41FI+7 g
45	2.1.11	Muro di contenimento - Tratto 2	40 g	mer 26/06/24	lun 05/08/24	42FI+15 g
46	**2.1.10**	**Completamento SP 103**	100 g	sab 26/04/25	lun 04/08/25	
47	2.1.10.1	Ripristino misto granulare	40 g	sab 26/04/25	gio 05/06/25	36;43;42;45;44
48	2.1.10.2	Asfalti - Strato di Collegamento (binder) e di usura	40 g	gio 05/06/25	mar 15/07/25	47
49	2.1.10.3	Installazione di barriere stradali	20 g	mar 15/07/25	lun 04/08/25	48
50	**2.2**	**Strada di accesso alla diga (pk.0+000 - 0+414.2)**	**633 g**	**mer 17/01/24**	**sab 11/10/25**	
51	2.2.1	Adeguamento fondazione stradale e scavo canalette	30 g	mer 17/01/24	ven 16/02/24	35
52	2.2.2	Base in misto granulare	30 g	ven 16/02/24	dom 17/03/24	51;30
53	2.2.3	Opere in calcestruzzo	30 g	dom 17/03/24	mar 16/04/24	52
54	**2.2.4**	**Completamento Strada di accesso alla diga**	40 g	lun 01/09/25	sab 11/10/25	
55	2.2.4.1	Ripristino misto granulare	15 g	lun 01/09/25	mar 16/09/25	53
56	2.2.4.2	Asfalti - Strato di Collegamento (binder) e di usura	15 g	mar 16/09/25	mer 01/10/25	55
57	2.2.4.3	Allestimenti stradali (segnaletica, guardrails, new-jersey, etc...)	10 g	mer 01/10/25	sab 11/10/25	56
58	**2.4**	**Strada di accesso alla vasca di carico (pk.0+000 - 0+759.82)**	**564 g**	**mar 14/05/24**	**sab 29/11/25**	
59	2.4.1	Pali diam.600 - pk.0+420 - 0+660	40 g	mar 14/05/24	dom 23/06/24	29FI+60 g
60	2.4.2	Muro di sostegno - pk.0+420 - 0+660	60 g	dom 23/06/24	gio 22/08/24	59

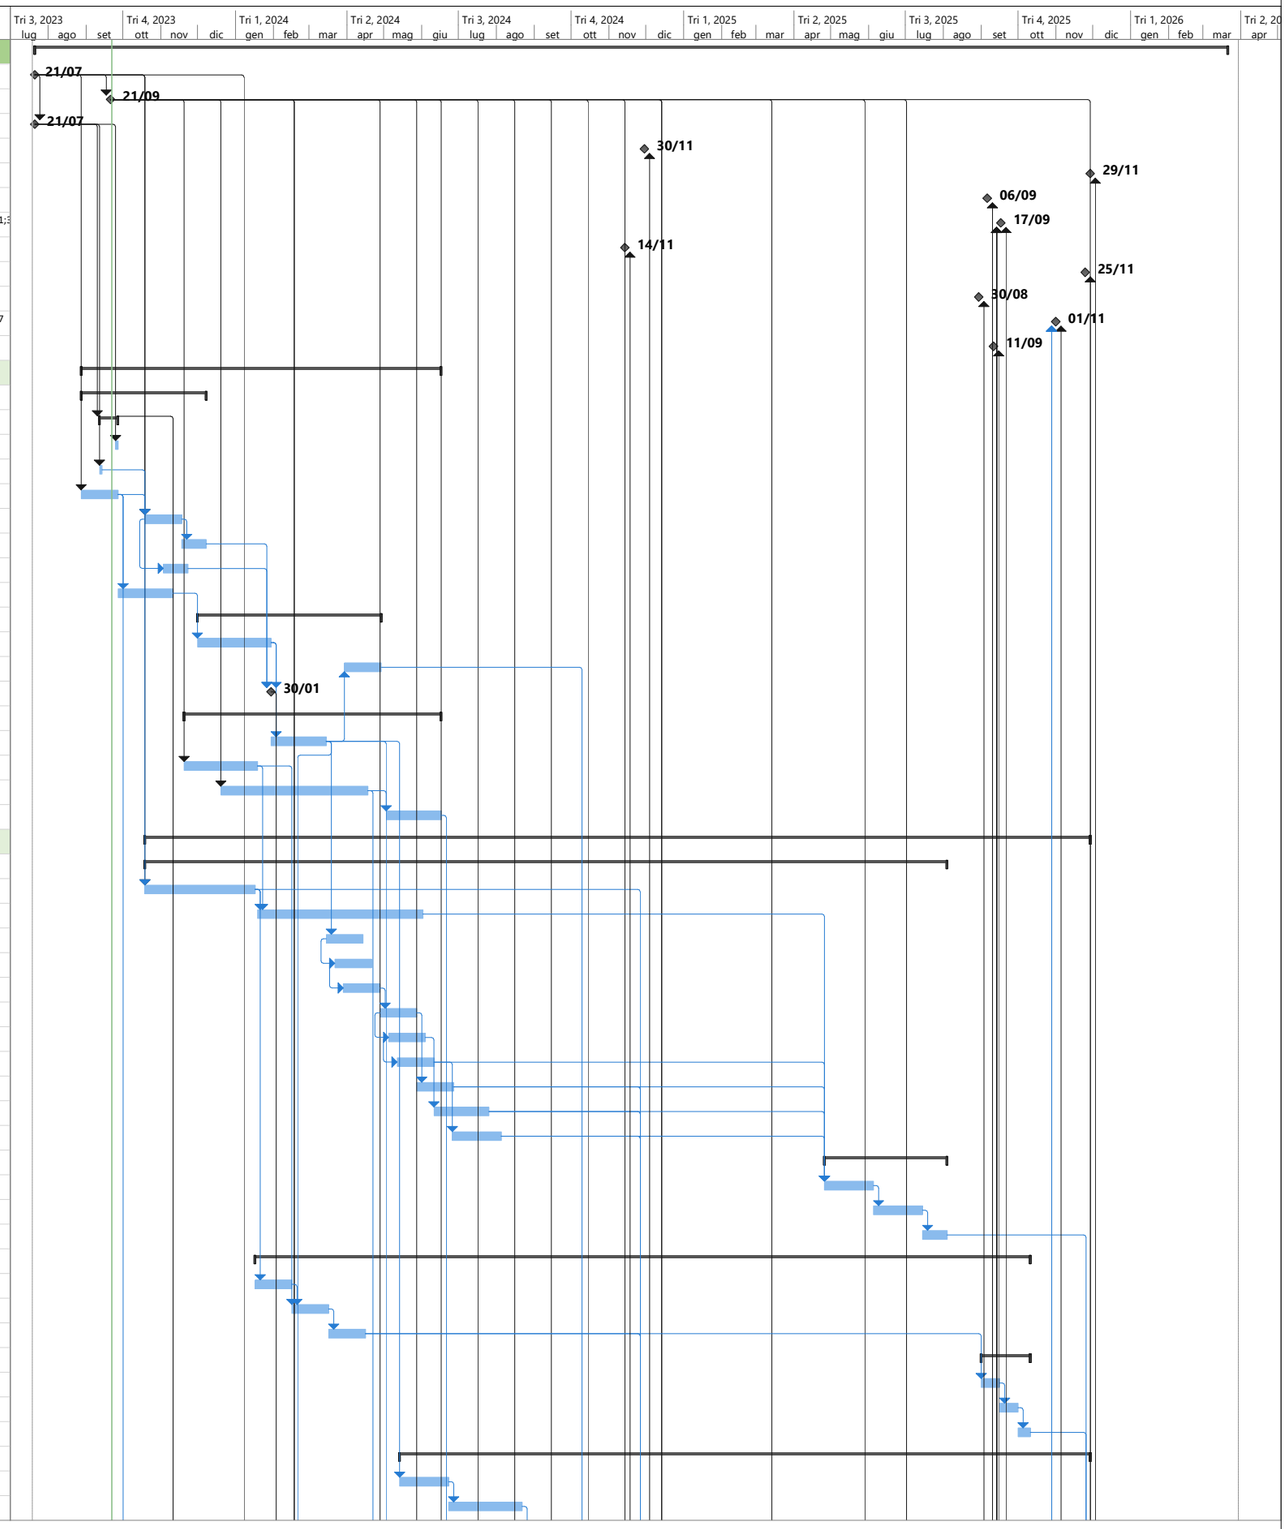

Progetto: Lavori di Completamento della Diga di Pietrarossa in territorio dei Comuni di Aidone (EN) e Mineo (CT)

Attività		Riepilogo		Cardine inattiva		Solo-durata		Solo inizio		Cardine esterno		Divisione critica	
Divisione		Riepilogo progetto		Riepilogo inattiva		Riporto riepilogo manuale		Solo-fine		Scadenza		Avanzamento	
Cardine		Attività inattiva		Attività manuale		Riepilogo manuale		Attività esterne		Critica		Avanzamento manuale	

ID	WBS	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Predecessori
61	2.4.3	Ritombamento - pk.0+420 - 0+660	30 g	gio 22/08/24	sab 21/09/24	60
62	2.4.4	Costruzione muri di contenimento - pk.0+200 - 0+740	30 g	sab 21/09/24	lun 21/10/24	61
63	2.4.5	Adeguamento fondazione stradale e scavo canalette	20 g	lun 21/10/24	dom 10/11/24	62
64	2.4.6	Base in misto granulare	20 g	dom 10/11/24	sab 30/11/24	63
65	**2.4.7**	**Completamento Strada di accesso alla vasca di carico**	60 g	mar 30/09/25	sab 29/11/25	
66	2.4.7.1	Ripristino misto granulare, canalette in c.a.	25 g	mar 30/09/25	sab 25/10/25	64;314
67	2.4.7.2	Asfalti - Strato di Collegamento (binder) e di usura	20 g	sab 25/10/25	ven 14/11/25	66
68	2.4.7.3	Allestimenti stradali (segnaletica, guardrails, new-jersey, etc...)	15 g	ven 14/11/25	sab 29/11/25	67
69	**2.3**	**Strada di accesso al piazzale sponda DX (pk.0+000 - 0+673)**	**165 g**	**sab 19/04/25**	**mer 01/10/25**	
70	2.3.1	Manufatto - pk.0+480	60 g	sab 19/04/25	mer 18/06/25	71IF-20 g
71	2.3.2	Costruzione fondazione stradale e scavo canalette	35 g	mar 08/07/25	mar 12/08/25	104
72	2.3.3	Base in misto granulare, canalette in c.a.	25 g	mar 12/08/25	sab 06/09/25	71
73	2.3.4	Asfalti - Strato di Collegamento (binder) e di usura	25 g	sab 06/09/25	mer 01/10/25	72
74	M1a	Milestone 1a - Costruzione strade di accesso (fase 1)	0 g	sab 30/11/24	sab 30/11/24	43;53;64;35;45;44
75	M1b	Milestone 1b - Sistemazioni stradali completate (fase 2)	0 g	sab 29/11/25	sab 29/11/25	73;49;57;68
76	**3**	**Interventi per la messa in sicurezza del versante in sponda destra (SCHEDA 3)**	**707 g**	**lun 08/01/24**	**lun 15/12/25**	
77	**3.1**	**Opere in c.a. per adeguamento sismico del muro di risvolto**	**156 g**	**lun 08/01/24**	**mer 12/06/24**	
78	3.1.1	Accesso a valle del muro di risvolto - Scavo fino a quota el.+183.00m	15 g	lun 08/01/24	mar 23/01/24	2FI+171 g
79	3.1.2	Inghisaggio ancoraggi e ferro di armatura N°6 contrafforti di valle	20 g	mar 23/01/24	lun 12/02/24	78
80	3.1.3	Casseratura e getto contrafforti di valle	30 g	gio 29/02/24	sab 30/03/24	79;29FI-15 g
81	3.1.4	Accesso a monte del muro di risvolto - Scavo fino a quota el.+183.00m	7 g	sab 06/04/24	sab 13/04/24	80FI+7 g
82	3.1.5	Inghisaggio ancoraggi e ferro di armatura N°6 contrafforti di monte	20 g	sab 13/04/24	ven 03/05/24	81
83	3.1.6	Casseratura e getto contrafforti di monte	40 g	ven 03/05/24	mer 12/06/24	82;29FI-15 g
84	**3.2**	**Diaframma in asse diga**	**401 g**	**gio 18/04/24**	**sab 24/05/25**	
85	**3.2.1**	**Diaframma su corpo diga**	**101 g**	**ven 20/09/24**	**lun 30/12/24**	
86	3.2.1.2	Costruzione correa in c.a. fino a el.+193.50m	20 g	ven 20/09/24	gio 10/10/24	142
87	3.2.1.3	Realizzazione diaframma in asse diga fino da el. 152.50m a el.+146.50m (N°8 dim.1000x2500mm)	21 g	gio 10/10/24	gio 31/10/24	86;26
88	3.2.1.4	Perforazione fori D100m ed iniezione per sigillatura diaframma	20 g	ven 15/11/24	gio 05/12/24	87FI+15 g
89	3.2.1.5	Demolizione e rimozione correa in c.a.	10 g	ven 20/12/24	lun 30/12/24	88FI+15 g
90	**3.2.2**	**Diaframma in sponda DX**	**401 g**	**gio 18/04/24**	**sab 24/05/25**	
91	3.2.2.1	Riempimento con materiale LS2 a valle del muro di risvolto del piazzale fino ad el.+193.00m (sez. 3, asse diga)	20 g	gio 18/04/24	mer 08/05/24	80;31
92	3.2.2.2	Costruzione correa in c.a. fino a el.+193.50m	20 g	mer 08/05/24	mar 28/05/24	91
93	3.2.2.3	Realizzazione diaframma in sponda DX - Pannelli 9-27 da quota 193.0m	40 g	ven 15/11/24	mer 25/12/24	92;87FI+15 g
94	2.2.2.4	Scavo sponda DX "a gradoni" da el. 208.00-197.00m per realizzazione corree	30 g	mer 08/05/24	ven 07/06/24	91
95	3.2.2.5	Costruzione correa in c.a. da el. +193.50m fino a el.+207.00m	60 g	sab 18/05/24	mer 17/07/24	94II+10 g
96	3.2.2.6	Realizzazione diaframma in sponda DX - Pannelli 28-65 da quota 195 a quota 206.50m	80 g	mer 01/01/25	sab 22/03/25	95II+15 g;93FI+7 g
97	3.3.2.7	Perforazione fori D100mm ed iniezione per sigillatura diaframma	100 g	gio 09/01/25	sab 19/04/25	93FI+15 g;96FF-15 g
98	3.3.2.8	Demolizione e rimozione correa in c.a.	100 g	ven 24/01/25	dom 04/05/25	97II+15 g
99	3.3.2.9	Riempimento con materiale LS2 a valle del muro di risvolto del piazzale fino ad el.+196.00m (sez. 3, asse diga)	20 g	dom 04/05/25	sab 24/05/25	98
100	3.3.2.10	- Diaframmi di tenuta idraulica completati	0 g	dom 04/05/25	dom 04/05/25	98
101	**3.3**	**Sistemazione versante in sponda DX**	**436 g**	**dom 28/04/24**	**mar 08/07/25**	
102	**3.3.1**	**Sistemazione versante Zona A1 (tra le sezioni D e 3)**	**65 g**	**dom 04/05/25**	**mar 08/07/25**	
103	3.3.1.1	Scavo/riprofilatura fino a el.+183.00m	20 g	dom 04/05/25	sab 24/05/25	100
104	3.3.1.2	Realizzazione trincee drenanti (dalla N°1 a N°3)	45 g	sab 24/05/25	mar 08/07/25	103
105	**3.3.2**	**Sistemazione versante Zona A2 (tra le sezioni 3 e 7)**	**370 g**	**dom 28/04/24**	**sab 03/05/25**	
106	3.3.2.1	Scavo a tergo del muro di sostegno piazzale fino a el.+190.50m	20 g	dom 28/04/24	sab 18/05/24	3FI+220 g
107	3.3.2.2	Realizzazione paratia drenante a pali secanti da el.+190.50 a el.+179.50m	150 g	sab 18/05/24	mar 15/10/24	106
108	3.3.2.3	Realizzazione del filtro con materiale di transizione fino a el.+191.00m	20 g	mar 15/10/24	lun 04/11/24	107
109	3.3.2.4	Riempimento a tergo del muro di sostegno con materiale LS2 fino ad el.+196.00m	30 g	lun 04/11/24	mer 04/12/24	108
110	3.3.2.5	Realizzazione trincee drenanti (dalla N°4 a N°12)	150 g	mer 04/12/24	sab 03/05/25	109
111	3.3.2.6	Muro di sostegno - Drenaggi e risanamento ammaloramento calcestruzzi	90 g	ven 03/01/25	gio 03/04/25	109FI+30 g
112	**3.3.3**	**Sistemazione versante Zona B (tra le sezioni 7 e 8-ter)**	**260 g**	**mar 28/05/24**	**mer 12/02/25**	
113	3.3.3.1	Scavo fino a el.+170.00m	30 g	mar 28/05/24	gio 27/06/24	3FI+250 g
114	3.3.3.2	Formazione dello strato inferiore del banchinamento	120 g	gio 27/06/24	ven 25/10/24	113
115	3.3.3.3	Formazione del rivestimento del banchinamento con scogliera	20 g	ven 25/10/24	gio 14/11/24	114
116	3.3.3.4	Realizzazione trincee drenanti (dalla N°13 a N°16)	90 g	gio 14/11/24	mer 12/02/25	115
117	**3.4**	**Realizzazione di opere di regimentazione idraulica Contrada Scoparso**	**135 g**	**mar 15/10/24**	**gio 27/02/25**	
118	3.4.1	Realizzazione canali di guardia in c.a.	60 g	mar 15/10/24	sab 14/12/24	3FI+390 g
119	3.4.2	Sistemazione dei fossi (salti di fondo e gabbioni cilindrici)	45 g	sab 14/12/24	mar 28/01/25	118
120	3.4.3	Realizzazione manufatti di recapito	30 g	mar 28/01/25	gio 27/02/25	119

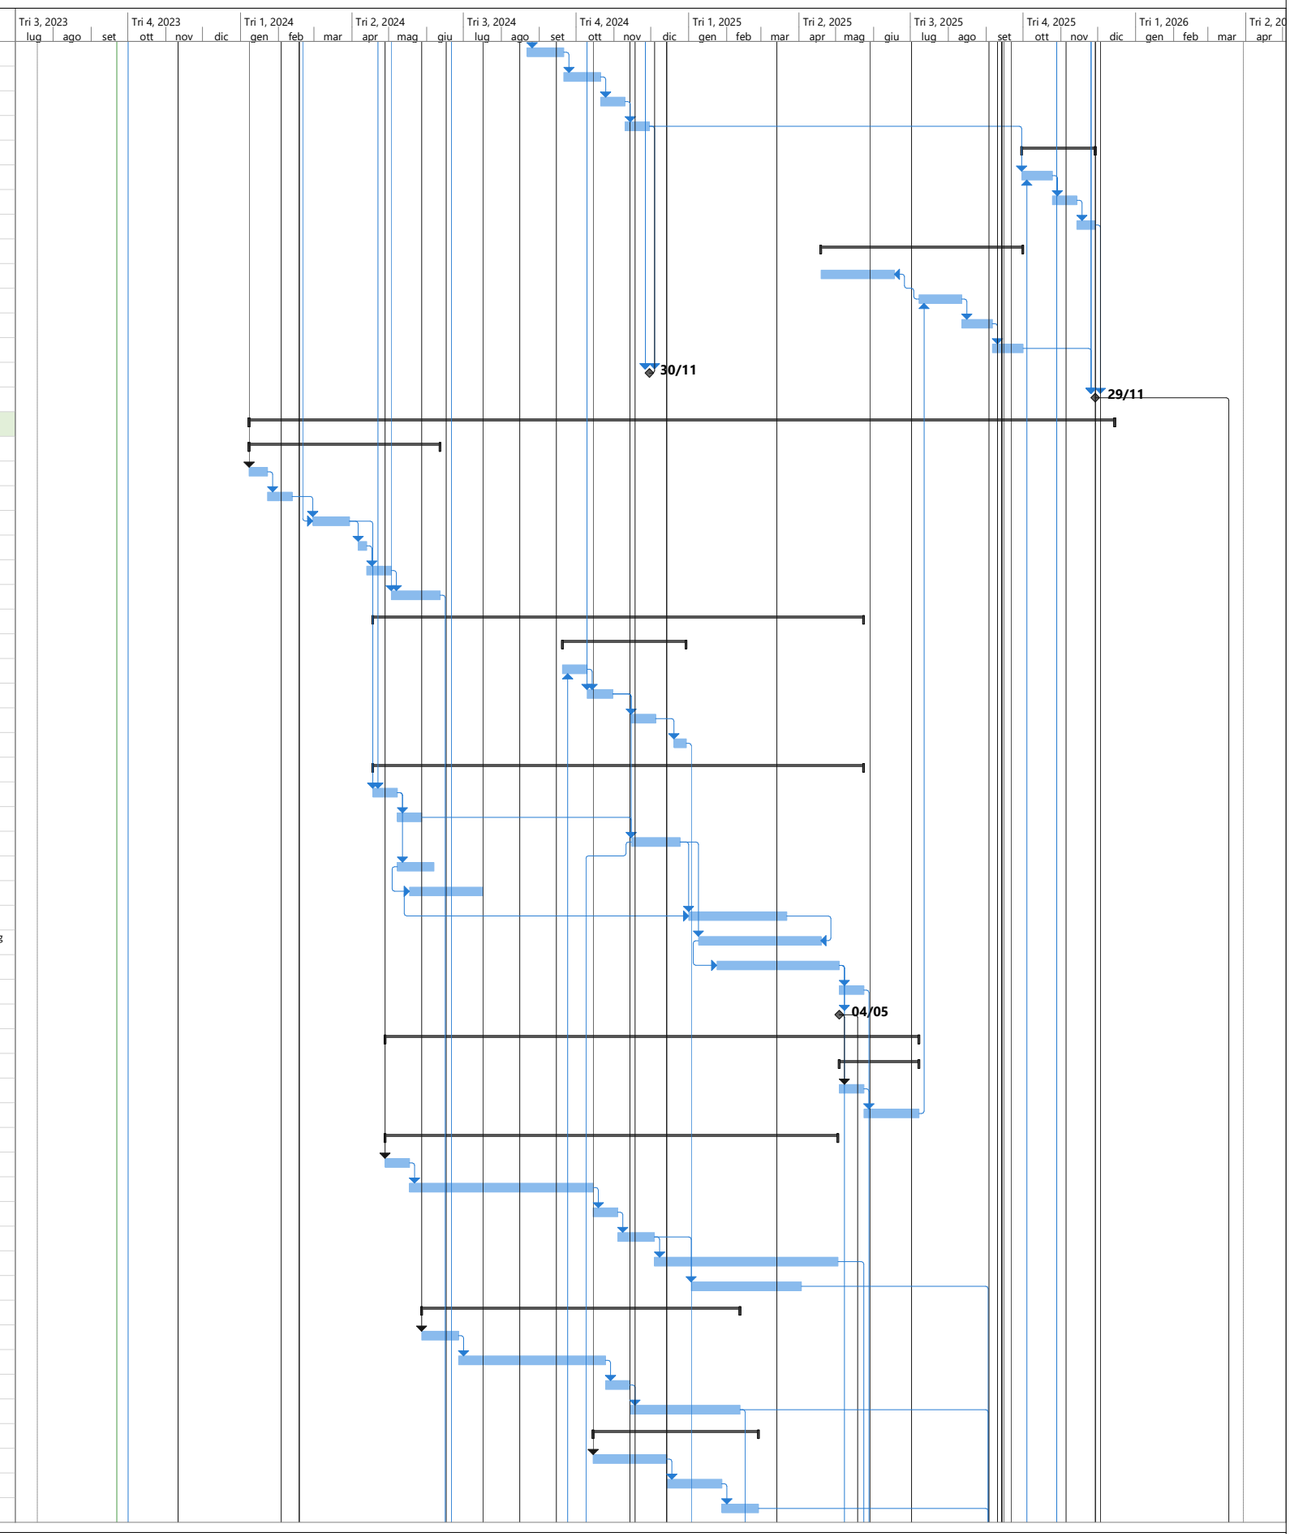

Progetto: Lavori di Completamento della Diga di Pietrarossa in territorio dei Comuni di Aidone (EN) e Mineo (CT)

Attività	Riepilogo	Cardine inattiva	Solo-durata	Solo inizio	Cardine esterno	Divisione critica
Divisione	Riepilogo progetto	Riepilogo inattiva	Riporto riepilogo manuale	Solo-fine	Scadenza	Avanzamento
Cardine	Attività inattiva	Attività manuale	Riepilogo manuale	Attività esterne	Critica	Avanzamento manuale

PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

ID	WBS	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Predecessori
121	**3.5**	**Realizzazione di lavori stradali a completamento del piazzale scarico superficie**	**105 g**	**sab 24/05/25**	**sab 06/09/25**	
122	3.5.1	Realizzazione sottofondo in misto stabilizzato	30 g	sab 24/05/25	lun 23/06/25	99;110
123	3.5.2	Posa canalette a completamento del piazzale scarico superficie	30 g	lun 23/06/25	mer 23/07/25	122
124	3.5.3	Realizzazione base stradale e pavimentazione in asfalto (binder e usura)	45 g	mer 23/07/25	sab 06/09/25	123
125	**3.6**	**Riprofilatura del versante in corrispondenza dell'ex laghetto collinare**	**30 g**	**dom 04/05/25**	**mar 03/06/25**	
126	3.6.1	Riprofilatura del versante in corrispondenza dell'ex laghetto collinare	30 g	dom 04/05/25	mar 03/06/25	98
127	**13.5**	**Impianti elettrici e speciali - Torri faro**	**90 g**	**sab 14/12/24**	**ven 14/03/25**	
128	13.5.1	Realizzazione di cavidotto e pozzetti di ispezione	60 g	sab 14/12/24	mer 12/02/25	3FI+450 g
129	13.5.2	Impianto di illuminazione N°4 Torri Faro esistenti	30 g	mer 12/02/25	ven 14/03/25	128
130	**11.2**	**Sistema di monitoraggio**	**95 g**	**lun 23/06/25**	**ven 26/09/25**	
131	11.2.1	Sistema di monitoraggio versante in sponda DX	75 g	dom 13/07/25	ven 26/09/25	135FF+20 g
132	11.2.2	Sistema di monitoraggio in asse diga (piazzale versante DX)	30 g	lun 23/06/25	mer 23/07/25	122
133	11.2.3	- Sistema di Monitoraggio Sponda DX completato	0 g	ven 26/09/25	ven 26/09/25	131;132
134	3.4.4	Rimboschimento versante	90 g	mar 16/09/25	lun 15/12/25	135FF+100 g
135	M3	**Milestone 3 - Completamento Interventi Messa in Sicurezza Versante sponda DX**	0 g	sab 06/09/25	sab 06/09/25	124;126;120;116;111
136	**8**	**Completamento corpo diga (SCHEDA 13)**	**561 g**	**lun 17/06/24**	**mar 30/12/25**	
137	**8.1**	**Sfalcio e taglio vegetazione, esecuzione di scavo di sbancamento corpo diga**	**136 g**	**ven 02/08/24**	**lun 16/12/24**	
138	8.1.1	Sfalcio e taglio vegetazione, e scavo di sbancamento (sez.12-13)	15 g	ven 02/08/24	sab 17/08/24	142IF-14 g
139	8.1.2	Sfalcio e taglio vegetazione, e di scavo di sbancamento corpo diga	45 g	ven 01/11/24	lun 16/12/24	144IF-14 g
140	**8.2**	**Completamento corpo diga sino a quota el.+193.00m (dx diga sez.12-13)**	**95 g**	**lun 17/06/24**	**ven 20/09/24**	
141	8.2.1	Rilevato Sperimentale - Prove di compattazione ed approvazione del metodo di esecuzione	60 g	lun 17/06/24	ven 16/08/24	32
142	8.2.2	Stesa e rullatura materiali sino a quota el.+193.00m (sez.12-13)	20 g	sab 31/08/24	ven 20/09/24	141FI+15 g
143	**8.2**	**Completamento corpo diga sino a quota di coronamento el.+196.00m**	**135 g**	**lun 30/12/24**	**mer 14/05/25**	
144	8.2.3	Stesa e rullatura materiali sino a quota el.+196.00m	135 g	lun 30/12/24	mer 14/05/25	89
145	8.3	Formazione rivestimento con scogliera	45 g	mer 14/05/25	sab 28/06/25	144
146	**8.4**	**Realizzazione strada di servizio**	**150 g**	**sab 28/06/25**	**mar 25/11/25**	
147	8.4.1	Realizzazione sottofondo in misto stabilizzato	30 g	sab 28/06/25	lun 28/07/25	145
148	8.4.2	Realizzazione fondazioni mini new-jersey e cavidotto	45 g	lun 28/07/25	gio 11/09/25	147
149	8.4.3	Realizzazione base stradale e pavimentazione in asfalto (binder e usura)	45 g	gio 11/09/25	dom 26/10/25	148
150	8.4.4	Installazione mini new-jersey e parapetti	30 g	dom 26/10/25	mar 25/11/25	149
151	M6	**Milestone 6 - Completamento Corpo Diga**	0 g	mar 25/11/25	mar 25/11/25	150
152	**13.5**	**Impianti elettrici e speciali**	**65 g**	**dom 26/10/25**	**mar 30/12/25**	
153	13.5.1	Impianto di illuminazione cresta diga	60 g	dom 26/10/25	gio 25/12/25	149
154	13.5.2	Impianto di videosorveglianza	45 g	sab 15/11/25	mar 30/12/25	153II+20 g
155	13.5.3	- Impianti Corpo Diga completati	0 g	mar 30/12/25	mar 30/12/25	154
156	11.1	Sistema di Monitoraggio Corpo Diga	150 g	ven 18/07/25	lun 15/12/25	151FF+20 g
157	**6.2**	**Canale Fugatore**	**465 g**	**ven 16/08/24**	**lun 24/11/25**	
158	**6.2.1**	**Passerella di attraversamento sul Canale Fugatore (in asse diga)**	**205 g**	**sab 03/05/25**	**lun 24/11/25**	
159	6.2.1.1	Fabbricazione e fornitura N° 4 travi prefabbricate L=27.70m e predalles	90 g	sab 03/05/25	ven 01/08/25	162IF-20 g
160	6.2.1.2	Rimozione travi prefabbricate esistenti	7 g	lun 04/08/25	lun 11/08/25	147FI+7 g
161	6.2.1.3	Posizionamento contropiastre ed appoggi	10 g	lun 11/08/25	gio 21/08/25	160
162	6.2.1.4	Varo delle travi prefabbricate ed inghisaggio appoggi	10 g	gio 21/08/25	dom 31/08/25	161
163	6.2.1.5	Realizzazione traversi in opera	20 g	dom 31/08/25	sab 20/09/25	162
164	6.2.1.6	Posa predalles ed armatura soletta impalcato	20 g	sab 20/09/25	ven 10/10/25	163
165	6.2.1.7	Getto impalcato e cordoli	15 g	ven 10/10/25	sab 25/10/25	164
166	6.2.1.8	Pavimentazione in asfalto ed installazione guardrails	30 g	sab 25/10/25	lun 24/11/25	165
167	6.2.1.9	- Passerella attraversamento Canale Fugatore opere civili completate	0 g	lun 24/11/25	lun 24/11/25	166
168	**6.2.2**	**Canale di scarico**	454 g	ven 16/08/24	gio 13/11/25	
169	6.2.2.1	Realizzazione micropali	30 g	ven 16/08/24	dom 15/09/24	3FI+330 g
170	6.2.2.2	Risanamento ammaloramento calcestruzzi	120 g	ven 06/06/25	sab 04/10/25	
171	6.2.2.3	Inghisaggio ancoraggi e ferro di armatura	20 g	sab 04/10/25	ven 24/10/25	169FI+150 g;162;170
172	6.2.2.4	Casseratura e getto	20 g	ven 24/10/25	gio 13/11/25	171
173	6.2.2.5	- Canale Fugatore opere civili completate	0 g	gio 13/11/25	gio 13/11/25	172
174	**4**	**Gallerie di accesso al cunicolo longitudinale esistente (SCHEDA 4)**	**740 g**	**dom 18/02/24**	**ven 20/02/26**	
175	**4.1**	**Nuova Galleria di accesso in destra**	**560 g**	**dom 18/02/24**	**dom 31/08/25**	
176	4.1.1	Pre-scavo di sbancamento fino a quota 174.13m per micropali	8 g	dom 18/02/24	lun 26/02/24	3FI+150 g
177	4.1.2	Micropali	45 g	lun 26/02/24	gio 11/04/24	176
178	4.1.3	Trave di coronamento in c.a.	20 g	gio 11/04/24	mer 01/05/24	177
179	4.1.4	Scavo e rivestimento del pozzo fino a quota 159.08m	60 g	mer 01/05/24	dom 30/06/24	178
180	4.1.5	Getto magrone el. 159.23m	7 g	dom 30/06/24	dom 07/07/24	179

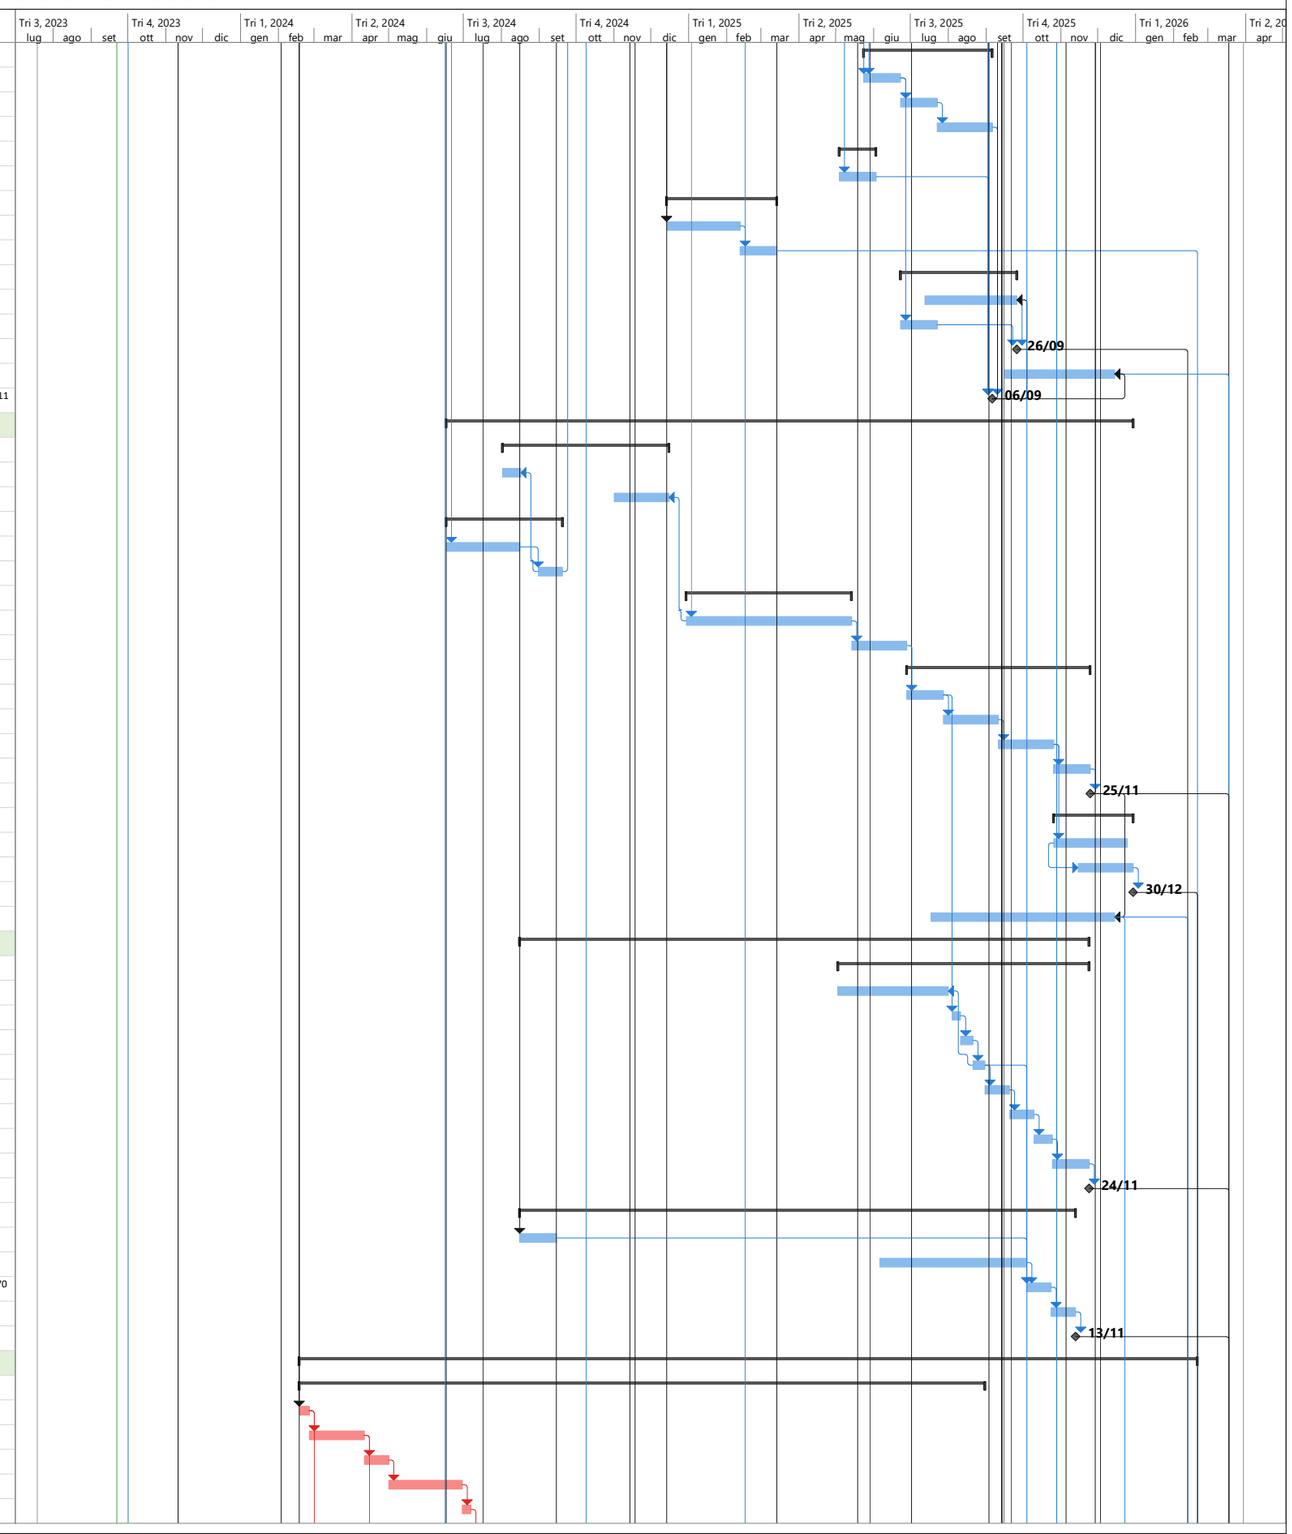

Progetto: Lavori di Completamento della Diga di Pietrarossa in territorio dei Comuni di Aidone (EN) e Mineo (CT)

Attività · Riepilogo · Cardine inattiva · Solo-durata · Solo inizio · Cardine esterno · Divisione critica
Divisione · Riepilogo progetto · Riepilogo inattiva · Riporto riepilogo manuale · Solo-fine · Scadenza · Avanzamento
Cardine · Attività inattiva · Attività manuale · Riepilogo manuale · Attività esterne · Critica · Avanzamento manuale

ID	WBS	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Predecessori
181	4.1.6	Impermeabilizzazione fondo pozzo	10 g	dom 07/07/24	mer 17/07/24	180
182	4.1.7	Solettone fino a quota 160.23m	20 g	mer 17/07/24	mar 06/08/24	181
183	4.1.8	Muro di spinta fresa	20 g	mar 06/08/24	lun 26/08/24	182
184	4.1.9	Pareti in c.a. perimetro pozzo fino a quota 166.23m	20 g	lun 26/08/24	dom 15/09/24	183
185	4.1.10	Getto per base di appoggio della fresa	20 g	dom 15/09/24	sab 05/10/24	184
186	**4.1.11**	**Scavo del cunicolo DX con fresa (63m)**	**210 g**	**mer 12/06/24**	**mer 08/01/25**	
187	4.1.11.1	Prefebbricazione elementi DN2600 per rivestimento cunicolo	120 g	mer 12/06/24	gio 10/10/24	189IF-15 g
188	4.1.11.2	Installazione attrezzature di scavo	20 g	sab 05/10/24	ven 25/10/24	185
189	4.1.11.3	Scavo cunicolo e rivestimento con tubo DN2600	30 g	ven 25/10/24	dom 24/11/24	188
190	4.1.11.4	Consolidamento con ombrello micropali (VTR) e trave di chiusura in calotta	15 g	dom 24/11/24	lun 09/12/24	189
191	4.1.11.5	Demolizione per innesto cunicolo esistente	10 g	lun 09/12/24	gio 19/12/24	190
192	4.1.11.6	Getti di regolarizzazione cunicolo e fondo pozzo	20 g	gio 19/12/24	mer 08/01/25	191
193	4.1.12	Pareti in c.a. fino a quota solaio 174.78m	30 g	mer 08/01/25	ven 07/02/25	192
194	4.1.13	Solaio in c.a. fino a quota 175.13m	20 g	ven 07/02/25	gio 27/02/25	193
195	4.1.14	Casotto di ingresso pozzo - muri in c.a. fino a quota 178.83m	30 g	gio 27/02/25	sab 29/03/25	194
196	4.1.15	Casotto di ingresso pozzo - solaio in c.a. fino a quota 179.53m	20 g	sab 29/03/25	ven 18/04/25	195
197	4.1.16	Lavori di carpenteria metallica - Scale e parapetti	60 g	ven 18/04/25	mar 17/06/25	196
198	4.1.17	Opere architettoniche e finiture	35 g	mar 17/06/25	mar 22/07/25	197
199	4.1.18	Sistemazione esterna, recinzione perimetrale e cancello di accesso	40 g	mar 22/07/25	dom 31/08/25	198
200	4.1.19	- Pozzo di Spinta e Cunicolo in DX completati	0 g	dom 31/08/25	dom 31/08/25	199
201	**4.2**	**Nuova Galleria di accesso in sinistra**	**642 g**	**lun 26/02/24**	**sab 29/11/25**	
202	4.2.1	Pre-scavo di sbancamento fino a el. 171.29m per micropali	8 g	lun 26/02/24	mar 05/03/24	176
203	4.2.2	Micropali	45 g	gio 11/04/24	dom 26/05/24	202;177
204	4.2.3	Trave di coronamento in c.a.	20 g	dom 26/05/24	sab 15/06/24	203
205	4.2.4	Scavo e rivestimento del pozzo fino a quota 158.29m	60 g	sab 15/06/24	mer 14/08/24	204
206	4.2.5	Getto magrone el. 158.44m	7 g	mer 14/08/24	mer 21/08/24	205
207	4.2.6	Impermeabilizzazione fondo pozzo	10 g	mer 21/08/24	sab 31/08/24	206
208	4.2.7	Solettone fino a quota 159.44m	20 g	sab 31/08/24	ven 20/09/24	207
209	4.2.8	Muro di spinta fresa	20 g	ven 20/09/24	gio 10/10/24	208
210	4.2.9	Pareti in c.a. perimetro pozzo fino a quota 165.44m	20 g	gio 10/10/24	mer 30/10/24	209
211	4.2.10	Getto per base di appoggio della fresa	20 g	mer 30/10/24	mar 19/11/24	210
212	**4.2.11**	**Scavo del cunicolo SX con fresa (120m)**	**270 g**	**ven 12/07/24**	**mar 08/04/25**	
213	4.2.11.1	Prefebbricazione elementi DN2600 per rivestimento cunicolo	150 g	ven 12/07/24	lun 09/12/24	215IF-15 g
214	4.2.11.2	Trasferimento attezzature di scavo ed installazione	20 g	mer 04/12/24	mar 24/12/24	211;189FI+10 g
215	4.2.11.3	Scavo cunicolo e rivestimento con tubo DN2600	60 g	mar 24/12/24	sab 22/02/25	214
216	4.2.11.4	Consolidamento con ombrello micropali (VTR) e trave di chiusura in calotta	15 g	sab 22/02/25	dom 09/03/25	215
217	4.2.11.5	Demolizione per innesto cunicolo esistente	10 g	dom 09/03/25	mer 19/03/25	216
218	4.2.11.6	Getti di regolarizzazione cunicolo e fondo pozzo	20 g	mer 19/03/25	mar 08/04/25	217
219	4.2.12	Pareti in c.a. fino a quota solaio 171.96m	30 g	mar 08/04/25	gio 08/05/25	218
220	4.2.13	Solaio in c.a. fino a quota 172.29m	20 g	gio 08/05/25	mer 28/05/25	219
221	4.2.14	Casotto di ingresso pozzo - muri in c.a. fino a quota 175.99m	30 g	mer 28/05/25	ven 27/06/25	220
222	4.2.15	Casotto di ingresso pozzo - solaio in c.a. fino a quota 176.69m	20 g	ven 27/06/25	gio 17/07/25	221
223	4.2.16	Lavori di carpenteria metallica - Scale e parapetti	60 g	gio 17/07/25	lun 15/09/25	222
224	4.2.17	Opere architettoniche e finiture	35 g	lun 15/09/25	lun 20/10/25	223
225	4.2.18	Sistemazione esterna, recinzione perimetrale e cancello di accesso	40 g	lun 20/10/25	sab 29/11/25	224
226	M2	**Milestone 2 - Completamento opere civili Gallerie di Accesso al cunicolo esistente**	0 g	sab 29/11/25	sab 29/11/25	225;200
227	**1.21.4**	**Cunicolo esistente Corpo Diga**	**90 g**	**mar 30/09/25**	**lun 29/12/25**	
228	1.21.4.1	Impianti elettrici / E-M	90 g	mar 30/09/25	lun 29/12/25	200FI+30 g
229	**13.7**	**Cunicoli SX e DX - Impianti elettrici, E-M e speciali**	**60 g**	**lun 29/12/25**	**ven 20/02/26**	
230	13.7.1	Impianto elettrico / E-M	30 g	lun 29/12/25	mar 27/01/26	228
231	13.7.2	Impianto di videosorveglianza	30 g	mar 27/01/26	ven 20/02/26	230;226
232	**1.21.6**	**Cunicolo longitudinale e pozzo di raccolta drenaggi**	**170 g**	**dom 31/08/25**	**gio 12/02/26**	
233	1.21.6.1	Risanamento ammaloramento calcestruzzi	45 g	dom 31/08/25	mer 15/10/25	200
234	1.21.6.2	Strumentazione monitoraggio portate cunicoli	20 g	mar 27/01/26	gio 12/02/26	233;230
235	**5.1**	**Stazione di sollevamento (SCHEDA 5)**	**255 g**	**mar 30/01/24**	**ven 11/10/24**	
236	5.1.1	Rimozione infissi, parapetti e demolizione solaio esistente	20 g	mar 30/01/24	lun 19/02/24	27
237	5.1.2	Cordoli e rinforzi sulle pareti perimetrali	20 g	lun 19/02/24	dom 10/03/24	236
238	5.1.3	Costruzione nuovo solaio di copertura	30 g	dom 10/03/24	mar 09/04/24	237
239	17.1	Risanamento ammaloramenti calcestruzzi (SCHEDA 5)	30 g	mar 09/04/24	gio 09/05/24	238
240	5.1.4	Installazione nuovi serramenti	20 g	gio 09/05/24	mer 29/05/24	239

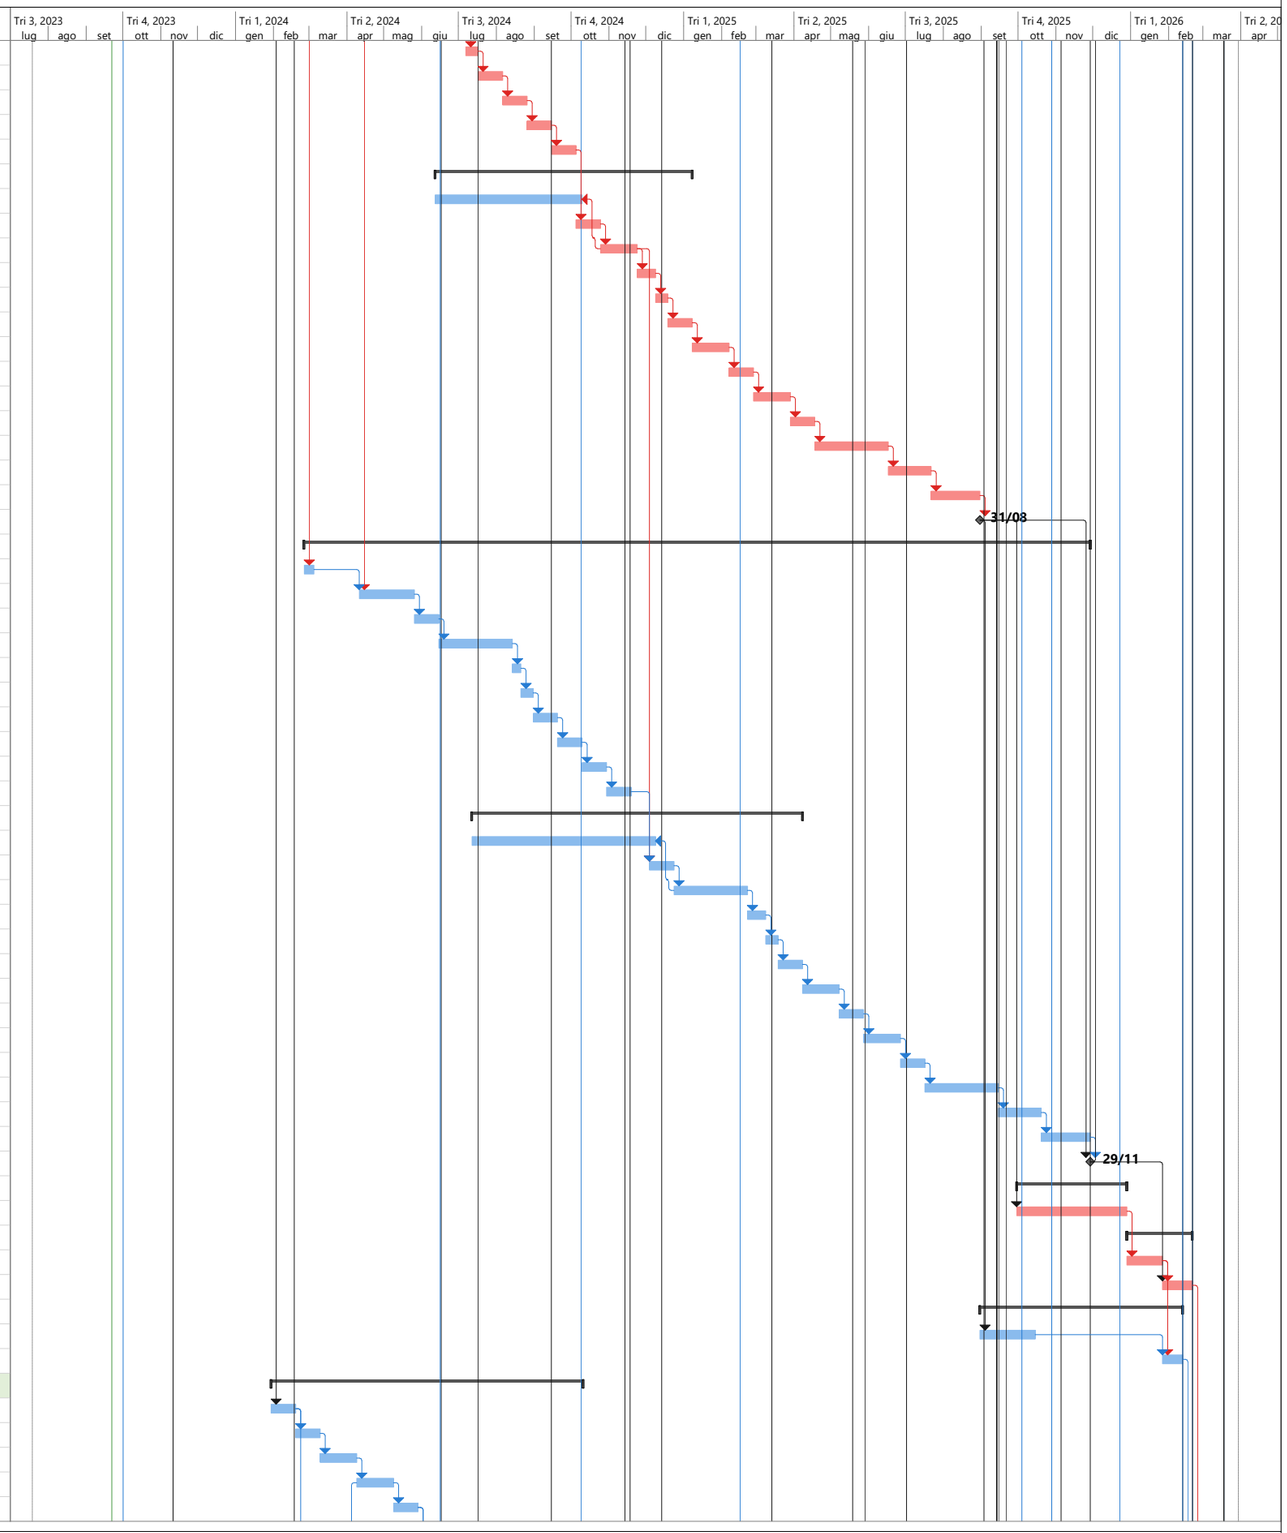

Progetto: Lavori di Completamento della Diga di Pietrarossa in territorio dei Comuni di Aidone (EN) e Mineo (CT)

Attività	Riepilogo	Cardine inattiva	Solo-durata	Solo inizio	Cardine esterno	Divisione critica
Divisione	Riepilogo progetto	Riepilogo inattiva	Riporto riepilogo manuale	Solo-fine	Scadenza	Avanzamento
Cardine	Attività inattiva	Attività manuale	Riepilogo manuale	Attività esterne	Critica	Avanzamento manuale

ID	WBS	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Predecessori
241	5.1.5	- Adeguamento sismico Stazione di Sollevamento completato	0 g	mer 29/05/24	mer 29/05/24	240
242	**12.1**	**Opere elettromeccaniche (SCHEDA 5)**	**190 g**	**lun 19/02/24**	**mar 27/08/24**	
243	**12.1.1**	**Manutenzione straordinaria carroponte esistente**	**80 g**	**lun 19/02/24**	**gio 09/05/24**	
244	12.1.1.1	Smontaggio e revisione in officina	60 g	lun 19/02/24	ven 19/04/24	236
245	12.1.1.2	Rimontaggio e messa in funzione	20 g	ven 19/04/24	gio 09/05/24	244
246	**12.1.2**	**Nuovo impianto di sollevamento**	**90 g**	**mer 29/05/24**	**mar 27/08/24**	
247	12.1.2.1	Installazione elettropompe, cassa d'aria, elettrocompressori, tubazioni e valvole.	90 g	mer 29/05/24	mar 27/08/24	245;240
248	**13.1**	**Impianti elettrici e speciali**	**60 g**	**ven 28/06/24**	**mar 27/08/24**	
249	13.1.1	Impianto elettrico	30 g	ven 28/06/24	dom 28/07/24	247II+30 g
250	13.1.2	Impianto di videosorveglianza e dati	30 g	dom 28/07/24	mar 27/08/24	249
251	**5.1.6**	**Cabina di ricevimento (consegna) e gruppo elettrogeno**	**110 g**	**lun 29/04/24**	**sab 17/08/24**	
252	17.2	Risanamento ammaloramenti calcestruzzi (SCHEDA 5)	30 g	lun 29/04/24	mer 29/05/24	239II+20 g
253	**13.8**	**Impianti elettrici e speciali**	**50 g**	**ven 28/06/24**	**sab 17/08/24**	
254	13.8.1	Impianto elettrico - Gruppo elettrogeno 25kVA, UPS, quadri elettrici	15 g	ven 28/06/24	sab 13/07/24	252FI+30 g
255	13.8.2	Impianto di videosorveglianza	15 g	ven 02/08/24	sab 17/08/24	254FI+20 g
256	**5.1.7**	**Cabina BT-MT**	**30 g**	**mer 11/09/24**	**ven 11/10/24**	
257	13.8.3	Gruppo elettrogeno 930kVA	30 g	mer 11/09/24	ven 11/10/24	254FI+60 g
258	**5.2**	**Torrino di disconnessione per la rete Ogliastro (SCHEDA 6)**	**190 g**	**gio 14/11/24**	**ven 23/05/25**	
259	5.2.1	Inghisaggio ferri di ripresa ed armatura	30 g	gio 14/11/24	sab 14/12/24	3FI+420 g
260	5.2.2	Getto setti di irrigidimento	20 g	sab 14/12/24	ven 03/01/25	259
261	17.5	Risanamento ammaloramenti calcestruzzi (SCHEDA 6)	30 g	ven 03/01/25	dom 02/02/25	260
262	5.2.3	Ripristino portone di ingresso, grigliati, passerelle, scale, parapetti	~~20 g~~	dom 02/02/25	sab 22/02/25	261
263	5.2.4	- Adeguamento sismico Torrino di Disconnessione completato	0 g	sab 22/02/25	sab 22/02/25	262
264	12.2	Opere E-M - Manutenzione organi di regolazione e condotte	45 g	sab 22/02/25	mar 08/04/25	263
265	13.2	Impianto elettrico	45 g	mar 08/04/25	ven 23/05/25	264
266	**5.3**	**Scarico di superficie (SCHEDA 7)**	**213 g**	**mer 12/06/24**	**sab 11/01/25**	
267	5.3.1	Accesso ai varchi - Sbancamento da el. +183.00m ad el.174.42m	30 g	mer 12/06/24	ven 12/07/24	83
268	**5.3.2**	**Spazio cavo N° 1&2**	**62 g**	**ven 12/07/24**	**gio 12/09/24**	
269	5.3.2.1	Demolizione - Apertura varco di accesso N°1&2	7 g	ven 12/07/24	ven 19/07/24	267
270	5.3.2.2	Inghisaggio connettori nello spazio cavo	7 g	ven 19/07/24	ven 26/07/24	269
271	5.3.2.3	Casseratura e getto spazi cavi (conci fase 1, 2, 3)	28 g	ven 26/07/24	ven 23/08/24	270
272	5.3.2.4	Inghisaggio connettori ed armatura varco	5 g	ven 23/08/24	mer 28/08/24	271
273	5.3.2.5	Casseratura, getto e scasseraura del varco	7 g	mer 28/08/24	mer 04/09/24	272
274	5.3.2.6	Inghisaggio connettori ed armatura muro esterno	20 g	dom 18/08/24	sab 07/09/24	270;273FF+3 g
275	5.3.2.7	Getto e scasseratura muro esterno	14 g	gio 29/08/24	gio 12/09/24	274FF+5 g
276	**5.3.3**	**Spazio cavo N° 3&4**	**83 g**	**ven 19/07/24**	**gio 10/10/24**	
277	5.3.3.1	Demolizione - Apertura varco di accesso N°3&4	7 g	ven 19/07/24	ven 26/07/24	269
278	5.3.3.2	Inghisaggio connettori nello spazio cavo	7 g	ven 26/07/24	ven 02/08/24	277
279	5.3.3.3	Casseratura e getto spazi cavi (conci fase 1, 2, 3)	28 g	ven 23/08/24	ven 20/09/24	278;271
280	5.3.3.4	Inghisaggio connettori ed armatura varco	5 g	ven 20/09/24	mer 25/09/24	279
281	5.3.3.5	Casseratura, getto e scasseraura del varco	7 g	mer 25/09/24	mer 02/10/24	280
282	5.3.3.6	Inghisaggio connettori ed armatura muro esterno	20 g	dom 15/09/24	sab 05/10/24	278;281FF+3 g
283	5.3.3.7	Getto e scasseratura muro esterno	14 g	gio 26/09/24	gio 10/10/24	282FF+5 g
284	**5.3.4**	**Spazio cavo N° 5&6**	**104 g**	**ven 26/07/24**	**gio 07/11/24**	
285	5.3.4.1	Demolizione - Apertura varco di accesso N°5&6	7 g	ven 26/07/24	ven 02/08/24	277
286	5.3.4.2	Inghisaggio connettori nello spazio cavo	7 g	ven 02/08/24	ven 09/08/24	285
287	5.3.4.3	Casseratura e getto spazi cavi (conci fase 1, 2, 3)	28 g	ven 20/09/24	ven 18/10/24	286;279
288	5.3.4.4	Inghisaggio connettori ed armatura varco	5 g	ven 18/10/24	mer 23/10/24	287
289	5.3.4.5	Casseratura, getto e scasseraura del varco	7 g	mer 23/10/24	mer 30/10/24	288
290	5.3.4.6	Inghisaggio connettori ed armatura muro esterno	20 g	dom 13/10/24	sab 02/11/24	286;289FF+3 g
291	5.3.4.7	Getto e scasseratura muro esterno	14 g	gio 24/10/24	gio 07/11/24	290FF+5 g
292	**5.3.5**	**Spazio cavo N° 7**	**132 g**	**ven 02/08/24**	**gio 12/12/24**	
293	5.3.5.1	Demolizione - Apertura varco di accesso N°7	7 g	ven 02/08/24	ven 09/08/24	285
294	5.3.5.2	Inghisaggio connettori nello spazio cavo	7 g	ven 09/08/24	ven 16/08/24	293
295	5.3.5.3	Casseratura e getto spazi cavi (conci fase 1, 2, 3, 4)	35 g	ven 18/10/24	ven 22/11/24	294;287
296	5.3.5.4	Inghisaggio connettori ed armatura varco	5 g	ven 22/11/24	mer 27/11/24	295
297	5.3.5.5	Casseratura, getto e scasseraura del varco	7 g	mer 27/11/24	mer 04/12/24	296
298	5.3.5.6	Inghisaggio connettori ed armatura muro esterno	20 g	dom 17/11/24	sab 07/12/24	294;297FF+3 g
299	5.3.5.7	Getto e scasseratura muro esterno	6 g	ven 06/12/24	gio 12/12/24	298FF+5 g
300	5.3.6	Rinterro e protezione canale di scarico fino a el.+183.00m	30 g	gio 12/12/24	sab 11/01/25	275;283;291;299

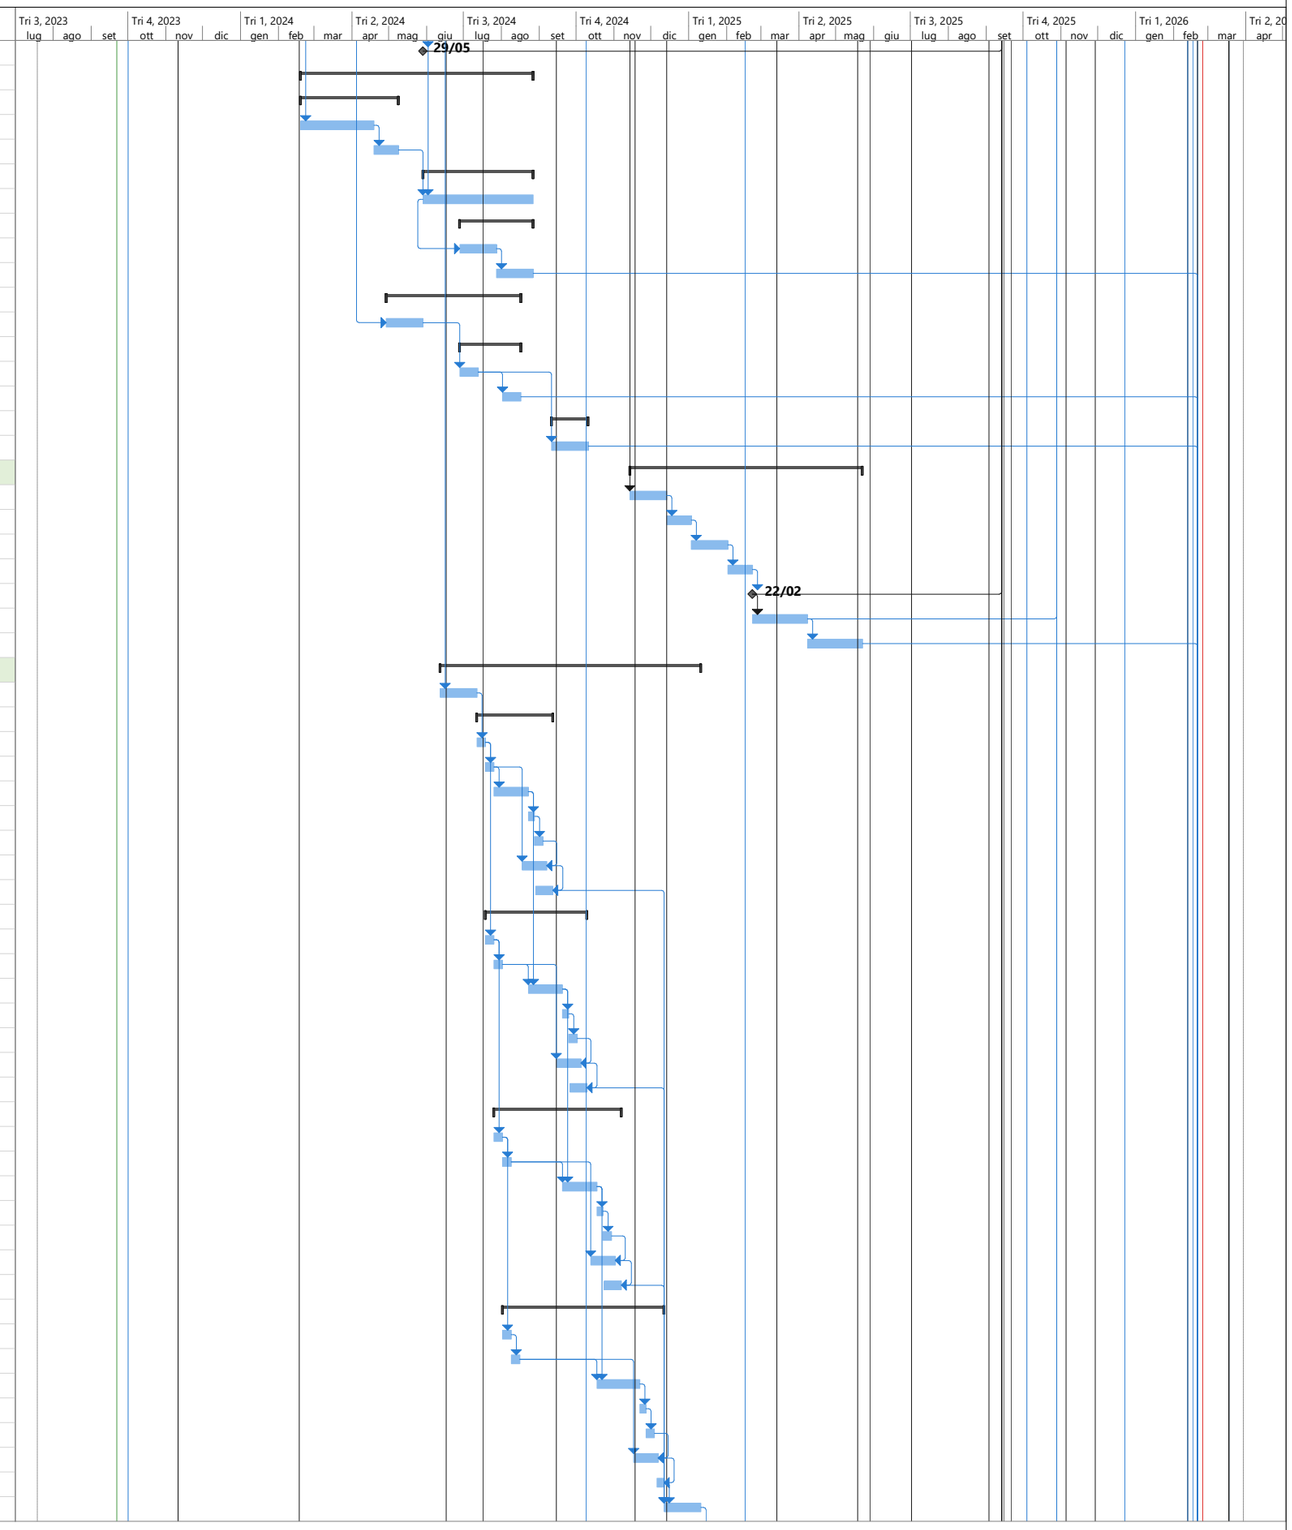

Progetto: Lavori di Completamento della Diga di Pietrarossa in territorio dei Comuni di Aidone (EN) e Mineo (CT)

Attività	Riepilogo	Cardine inattiva	Solo-durata	Solo inizio	Cardine esterno	Divisione critica
Divisione	Riepilogo progetto	Riepilogo inattiva	Riporto riepilogo manuale	Solo-fine	Scadenza	Avanzamento
Cardine	Attività inattiva	Attività manuale	Riepilogo manuale	Attività esterne	Critica	Avanzamento manuale

PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

ID	WBS	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Predecessori
301	5.3.7	- Adeguamento sismico Scarico di superficie completato	0 g	sab 11/01/25	sab 11/01/25	300
302	**5.4**	**Vasca di carico e compensazione Pizzo Tre Punte (SCHEDA 8)**	**290 g**	**sab 14/12/24**	**mar 30/09/25**	
303	5.4.1	Inghisaggio ancoraggi ed armatura	30 g	sab 14/12/24	lun 13/01/25	3FI+450 g
304	5.4.2	Casseratura e getto ringrosso alla base del muro	30 g	lun 13/01/25	mer 12/02/25	303
305	17.6	Risanamento ammaloramenti calcestruzzi (SCHEDA 8)	45 g	lun 13/01/25	gio 27/02/25	304II
306	5.4.3	- Adeguamento sismico Vasca di Carico completato	0 g	gio 27/02/25	gio 27/02/25	305
307	**12.4**	**Opere E-M - Manutenzione organi di regolazione e condotte**	**90 g**	**gio 27/02/25**	**mer 28/05/25**	
308	12.4.1	Vasca di carico - Manutenzione piping	75 g	gio 27/02/25	mar 13/05/25	306
309	12.4.2	Condotta di adduzione - Sostituzione sfiati e saracinesche	15 g	mar 13/05/25	mer 28/05/25	308
310	**13.3**	**Impianti elettrici e speciali (SCHEDA 8)**	**215 g**	**gio 27/02/25**	**mar 30/09/25**	
311	13.3.1	Realizzazione cavidotto	90 g	gio 27/02/25	mer 28/05/25	306
312	13.3.2	Gruppo elettrogeno 25kVA	30 g	mer 28/05/25	ven 27/06/25	311
313	13.3.3	Impianti elettrici e di illuminazione	45 g	ven 27/06/25	lun 11/08/25	312
314	13.3.4	Impianto di videosorveglianza e Dati	30 g	dom 31/08/25	mar 30/09/25	313FI+20 g;309FF
315	**6**	**Pozzo Paratoie (SCHEDA 9)**	**445 g**	**lun 11/11/24**	**mer 28/01/26**	
316	**6.1**	**Passerella di collegamento Pozzo Paratoie**	**235 g**	**lun 11/11/24**	**ven 04/07/25**	
317	6.1.1	Fabbricazione e fornitura N° 6 travi prefabbricate L=27.40m e predalles	120 g	lun 11/11/24	mar 11/03/25	320FF-30 g
318	6.1.2	Rimozione travi prefabbricate esistenti	12 g	mer 12/02/25	lun 24/02/25	116
319	6.1.3	Posizionamento contropiastre ed appoggi	10 g	dom 16/03/25	mer 26/03/25	318FI+20 g
320	6.1.4	Varo delle travi prefabbricate ed inghisaggio appoggi	15 g	mer 26/03/25	gio 10/04/25	319
321	6.1.5	Realizzazione traversi in opera	20 g	gio 10/04/25	mer 30/04/25	320
322	6.1.6	Posa predalles ed armatura soletta impalcato	20 g	mer 30/04/25	mar 20/05/25	321
323	6.1.7	Getto impalcato e cordoli	15 g	mar 20/05/25	mer 04/06/25	322
324	6.1.8	Pavimentazione in asfalto ed installazione guardrails	30 g	mer 04/06/25	ven 04/07/25	323
325	6.1.9	- Passerella di collegamento al Pozzo paratoie completatata	0 g	ven 04/07/25	ven 04/07/25	324
326	**5.5**	**Torre pozzo paratoie**	**141 g**	**mar 29/04/25**	**mer 17/09/25**	
327	17.4	Risanamento ammaloramenti calcestruzzi (SCHEDA 9)	30 g	ven 04/07/25	dom 03/08/25	324
328	5.5.1	Recupero e manutenzione opere in ferro esistenti	45 g	ven 04/07/25	lun 18/08/25	324
329	5.5.2	Scala di accesso - Fornitura elementi metallici di rinforzo strutturale	90 g	mar 29/04/25	lun 28/07/25	330IF-21 g
330	5.5.3	Scala di accesso - Installazione elementi di rinforzo	30 g	lun 18/08/25	mer 17/09/25	328
331	5.5.4	- Adeguamento sismico Scala Pozzo Paratoie completato	0 g	mer 17/09/25	mer 17/09/25	330
332	**12.5**	**Opere elettromeccaniche (SCHEDA 9)**	**120 g**	**ven 04/07/25**	**sab 01/11/25**	
333	12.5.1	Revisione e collaudo del carroponte	30 g	ven 04/07/25	dom 03/08/25	327II
334	12.5.2	Revisione delle paratoie e dei cilindri oleodinamici dello scarico di fondo	90 g	dom 03/08/25	sab 01/11/25	333
335	12.5.3	Revisione delle 4 paratoie esterne imbocco derivazione	60 g	mer 13/08/25	dom 12/10/25	334II+10 g
336	12.5.4	- Opere E-M Pozzo Paratoie completate	0 g	sab 01/11/25	sab 01/11/25	334;335
337	**13.4**	**Impianti elettrici e speciali (SCHEDA 9)**	**90 g**	**sab 01/11/25**	**mer 28/01/26**	
338	13.4.1	Impianto elettrico di illuminazione	30 g	sab 01/11/25	lun 01/12/25	336
339	13.4.2	Gruppo elettrogeno 120kVA	30 g	lun 01/12/25	mer 31/12/25	338
340	13.4.3	Impianto di videosorveglianza e Dati	30 g	mer 31/12/25	mer 28/01/26	339
341	13.4.4	- Impianti elettrici Pozzo Paratoie completati	0 g	mer 28/01/26	mer 28/01/26	340
342	**9**	**Adeguamento Opere di Presa in Destra e Sinistra idraulica (SCHEDA 10)**	**169 g**	**ven 14/03/25**	**sab 30/08/25**	
343	**9.1**	**Opera di Presa in Destra**	**70 g**	**ven 14/03/25**	**ven 23/05/25**	
344	9.1.1	Inghisaggio ancoraggi e ferro di armatura fino a el. 178.20m	20 g	ven 14/03/25	gio 03/04/25	3FI+540 g
345	9.1.2	Casseratura e getto fino ad el. 178.20m	20 g	lun 24/03/25	dom 13/04/25	344II+10 g
346	9.1.3	Armatura fino ad el. 180.60m	20 g	dom 13/04/25	sab 03/05/25	345
347	9.1.4	Casseratura e getto fino ad el. 180.60m	30 g	mer 23/04/25	ven 23/05/25	346II+10 g
348	**9.2**	**Opera di Presa in Sinistra**	**93 g**	**gio 29/05/25**	**sab 30/08/25**	
349	9.2.1	Scavo di sbancamento fino a el. 174.50m	10 g	gio 29/05/25	dom 08/06/25	3FI+610 g
350	9.2.2	Inghisaggio ancoraggi e ferro di armatura	21 g	dom 08/06/25	dom 29/06/25	349;347
351	9.2.3	Casseratura e getto	21 g	lun 23/06/25	lun 14/07/25	350II+15 g
352	9.2.4	Rinterro	10 g	lun 21/07/25	gio 31/07/25	351FI+7 g
353	9.2.5	Galleria - Risanamento ammaloramento calcestruzzi	30 g	gio 31/07/25	sab 30/08/25	352
354	M7	**Milestone 7 - Completamento Adeguamento Opere di Presa in DX e SX idraulica**	0 g	sab 30/08/25	sab 30/08/25	353;347
355	**9.3**	**Galleria Scarico di Fondo**	750 g	mer 27/09/23	gio 16/10/25	
356	9.3.3	Scavi per pulizia idraulica del Canale di Derivazione e del Canale di Restituzione	20 g	mer 27/09/23	mar 17/10/23	19
357	9.3.1	Monitoraggio - Installazione stazione misure di convergenza	20 g	mer 11/09/24	mar 01/10/24	93IF-45 g
358	9.3.2	Risanamento Ammaloramento calcestruzzi	150 g	lun 19/05/25	gio 16/10/25	100FI+15 g
359	**7**	**Pozzo di aggottamento (SCHEDA 11)**	**75 g**	**mer 17/07/24**	**lun 30/09/24**	
360	17.3	Risanamento ammaloramenti calcestruzzi (SCHEDA 11)	30 g	mer 17/07/24	ven 16/08/24	3FI+300 g

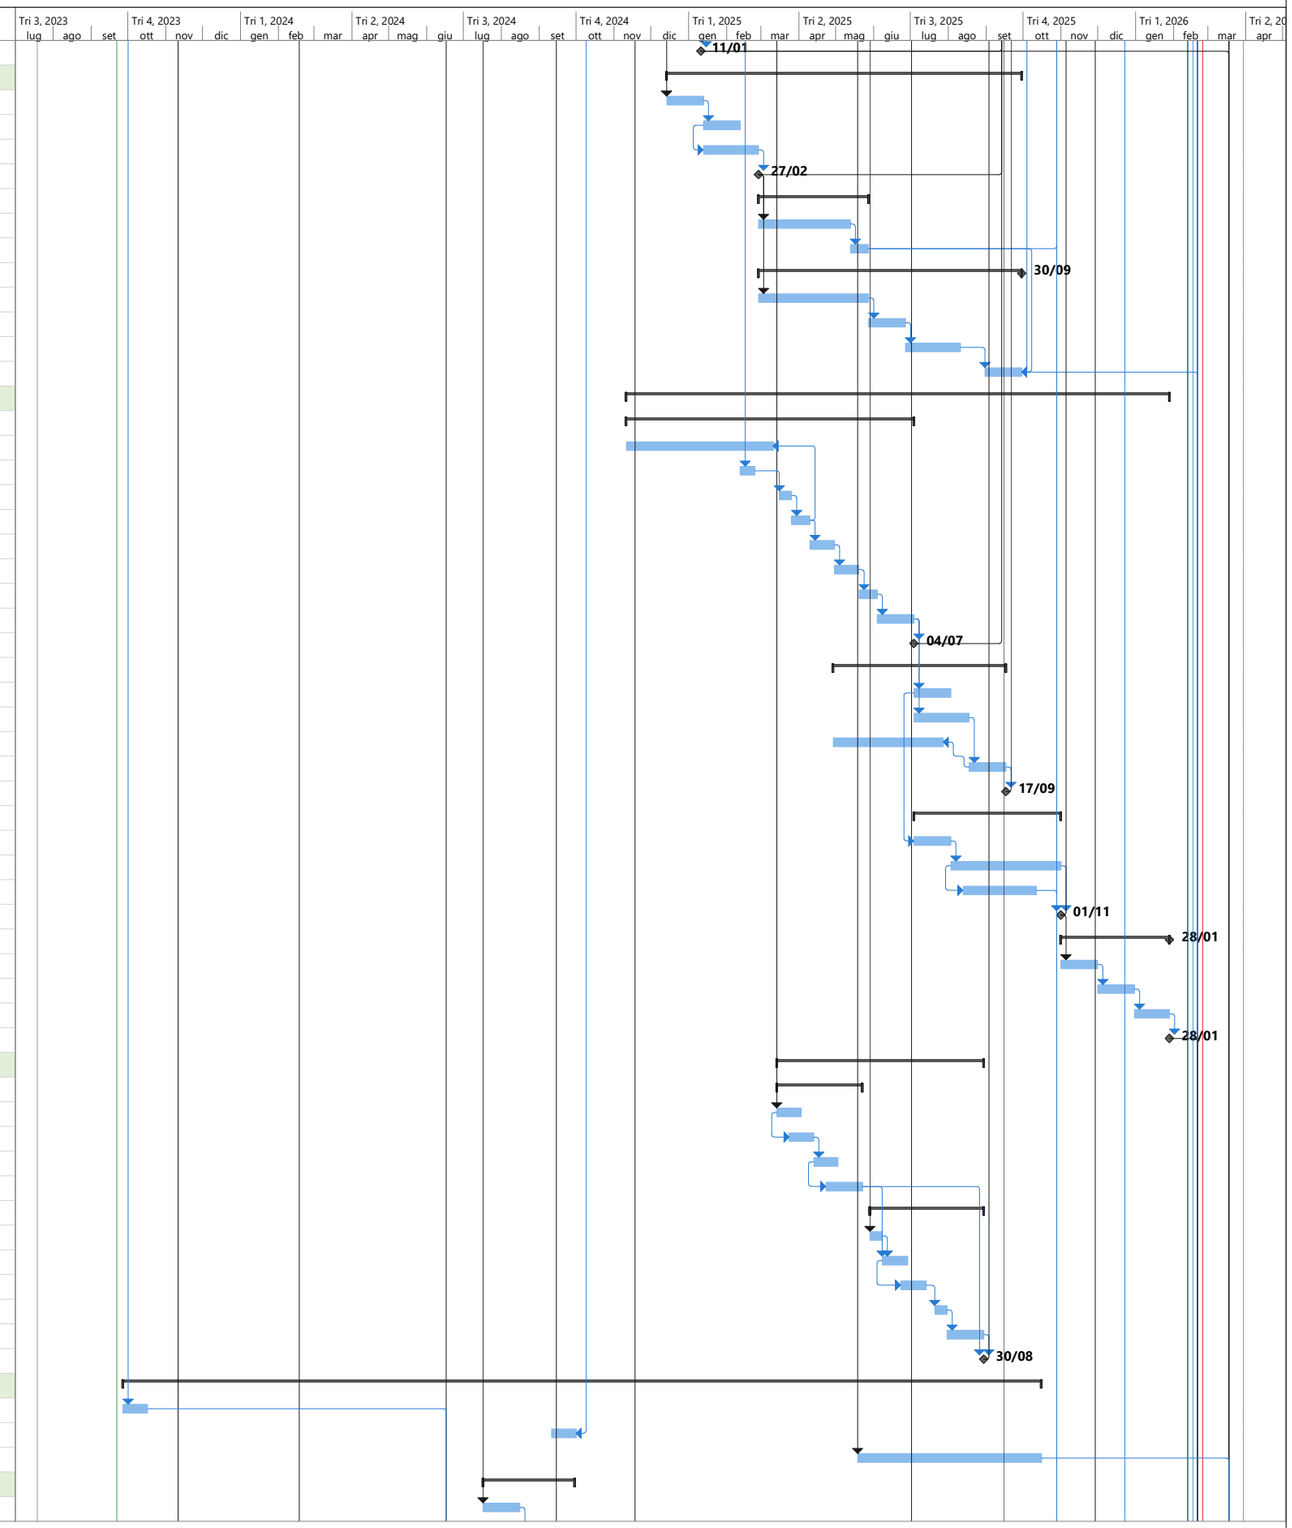

Progetto: Lavori di Completamento della Diga di Pietrarossa in territorio dei Comuni di Aidone (EN) e Mineo (CT)

Attività	Riepilogo	Cardine inattiva	Solo-durata	Solo inizio	Cardine esterno	Divisione critica
Divisione	Riepilogo progetto	Riepilogo inattiva	Riporto riepilogo manuale	Solo-fine	Scadenza	Avanzamento
Cardine	Attività inattiva	Attività manuale	Riepilogo manuale	Attività esterne	Critica	Avanzamento manuale

PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

ID	WBS	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Predecessori
361	**13.8**	**Impianti elettrici e speciali**	**45 g**	**ven 16/08/24**	**lun 30/09/24**	
362	13.8.1	Impianto elettrico	30 g	ven 16/08/24	dom 15/09/24	360
363	13.8.2	Impianto di videosorveglianza e Dati	25 g	gio 05/09/24	lun 30/09/24	362II+20 g
364	13.8.3	- Impianti elettrici Pozzo di Aggottamento completati	0 g	lun 30/09/24	lun 30/09/24	363
365	**15**	**Manufatti ispezione rete irrigua Ogliastro (SCHEDA 12)**	**60 g**	**dom 15/09/24**	**gio 14/11/24**	
366	17.7	Risanamento ammaloramenti calcestruzzi (SCHEDA 12)	30 g	dom 15/09/24	mar 15/10/24	3FI+360 g
367	12.8	Interventi di ripristino degli organi di manovra della condotta	30 g	mar 15/10/24	gio 14/11/24	366
368	15.1	- Lavori alla Rete Irrigua Ogliastro completati	30 g	gio 14/11/24	sab 14/12/24	367
369	**10**	**Casa di Guardia (SCHEDA 14)**	**519 g**	**sab 11/11/23**	**dom 13/04/25**	
370	**10.1**	**Demolizione fabbricato esistente**	**30 g**	**sab 11/11/23**	**lun 11/12/23**	
371	10.1.1	Installazione della recinzione di sicurezza	5 g	sab 11/11/23	gio 16/11/23	16FI+45 g
372	10.1.2	Demolizione fabbricato	25 g	gio 16/11/23	lun 11/12/23	371
373	**10.2**	**Esecuzione fondazioni e opere in elevazione in c.a.**	**150 g**	**dom 18/02/24**	**mer 17/07/24**	
374	10.2.1	Scavo e fondazioni in c.a. fino a el.+0.00	45 g	dom 18/02/24	mer 03/04/24	372FI+15 g;3FI+150 g
375	10.2.2	Opere in elevazione in c.a. fino a el.+3.04	45 g	mer 03/04/24	sab 18/05/24	374
376	10.2.3	Opere in elevazione in c.a. fino a el.+7.80 incluso solai	60 g	sab 18/05/24	mer 17/07/24	375
377	**10.3**	**Finiture ed impianti**	**120 g**	**mer 17/07/24**	**gio 14/11/24**	
378	10.3.1	Finiture	90 g	mer 17/07/24	mar 15/10/24	376
379	10.3.2	Impianti idrico-sanitari	60 g	dom 15/09/24	gio 14/11/24	378FI-30 g
380	M5	**Milestone 5 - Completamento opere civili Casa di Guardia**	0 g	gio 14/11/24	gio 14/11/24	379
381	**13.6**	**Impianti elettrici e speciali (SCHEDA 14)**	**120 g**	**mar 15/10/24**	**mer 12/02/25**	
382	13.6.1	Impianto elettrico	45 g	mar 15/10/24	ven 29/11/24	378
383	13.3.4	Impianto fotovoltaico e solare termico	30 g	gio 14/11/24	sab 14/12/24	379
384	10.3.3	Impianto di climatizzazione	30 g	dom 24/11/24	mar 24/12/24	383II+10 g
385	13.6.2	Impianto antincendio	30 g	ven 29/11/24	dom 29/12/24	382
386	13.6.3	Impianto di videosorveglianza e dati	30 g	dom 29/12/24	mar 28/01/25	385
387	13.6.4	Impianto segnali di stato delle paratoie	30 g	lun 13/01/25	mer 12/02/25	385FI+15 g
388	13.6.5	- Completamento Impianti Casa di Guardia	0 g	mer 12/02/25	mer 12/02/25	387;384;383;386
389	**13.6**	**Sistema di Monitoraggio**	**30 g**	**ven 14/03/25**	**dom 13/04/25**	
390	13.6.1	Installazione Centrale di Controllo	15 g	ven 14/03/25	sab 29/03/25	388FI+30 g
391	13.6.2	Installazione sistema di monitoraggio accelerometrico	15 g	sab 29/03/25	dom 13/04/25	390
392	**10.3**	**Viali e Piazzali**	**125 g**	**ven 29/11/24**	**gio 03/04/25**	
393	10.6.5	Realizzazione di cavidotto e pozzetti di ispezione	45 g	ven 29/11/24	lun 13/01/25	379FI+15 g
394	13.6.6	Impianto di illuminazione	60 g	dom 02/02/25	gio 03/04/25	393FI+20 g
395	**14**	**Alveo di valle (SCHEDA 15)**	**617 g**	**lun 17/06/24**	**mer 18/02/26**	
396	14.1	Sistemazione idraulica alveo di valle - Pulizia	120 g	lun 17/06/24	dom 13/07/25	3FI+270 g;356
397	14.2	Difesa della sponda esterna della curva	45 g	lun 28/07/25	gio 11/09/25	396FI+15 g
398	**14.3**	**Vasca di Dissipazione - Completamento muro perimetrale**	**87 g**	**sab 29/11/25**	**mer 18/02/26**	
399	14.3.1	Inghisaggio ancoraggi ed armatura	21 g	sab 29/11/25	sab 20/12/25	3FI+800 g
400	14.3.2	Casseratura e getto ringrosso alla base del muro	21 g	sab 20/12/25	sab 10/01/26	399
401	14.3.3	Risanamento ammaloramenti calcestruzzi (SCHEDA 8)	45 g	sab 10/01/26	mer 18/02/26	400
402	M9	**Milestone 9 - Completamento Sistemazione Idraulica Alveo di Valle**	0 g	gio 11/09/25	gio 11/09/25	397
403	**16**	**Torrino Ramacca**	**30 g**	**mer 02/07/25**	**ven 01/08/25**	
404	16.1	Opere E-M - Manutenzione straordinaria organi di regolazione	30 g	mer 02/07/25	ven 01/08/25	3FI+650 g
405	**11.4**	**Strumentazione Monitoraggio Invaso**	**312,13 g**	**lun 31/03/25**	**mer 04/02/26**	
406	11.4.1	Misuratore livelli invaso e temperatura	15 g	dom 30/11/25	lun 15/12/25	156FF
407	11.4.2	Stazione monitoraggio portata scaricata	10 g	mar 30/12/25	ven 09/01/26	406FI+15 g
408	11.4.3	Stazioni di monitoraggio livelli idrometrici (ponte su SP103 e SP48)	14 g	ven 23/01/26	mer 04/02/26	407FI+15 g
409	**17**	**Strada circumlacuale**	**210 g**	**lun 31/03/25**	**lun 27/10/25**	
410	17.1	Ricevimento della Progettazione Esecutiva del percorso circumlacuale	0 g	lun 31/03/25	lun 31/03/25	
411	17.2	Realizzazione del percorso circumlacuale - movimento terra	120 g	mar 01/04/25	mar 29/07/25	410
412	17.3	Realizzazione del percorso circumlacuale - pavimentazione misto granulare	150 g	sab 31/05/25	lun 27/10/25	411FI-60 g
413	0.4	**# Completamento Impianti Elettrici e Speciali**	35 g	ven 20/02/26	sab 21/03/26	129;155;231;250;255;2
414	0.5	**# Completamento e verifica Sistemi di Monitoraggio**	30 g	gio 12/02/26	lun 09/03/26	133;156;391;234
415	0.6	**CERTIFICATO ULTIMAZIONE LAVORI**	**0 g**	**sab 21/03/26**	**sab 21/03/26**	**75;408;368;167;134;41**
416	0.7	Demobilizzazione baraccamenti di cantiere e ripristino del piazzale	20 g	ven 13/03/26	dom 29/03/26	415FF+10 g

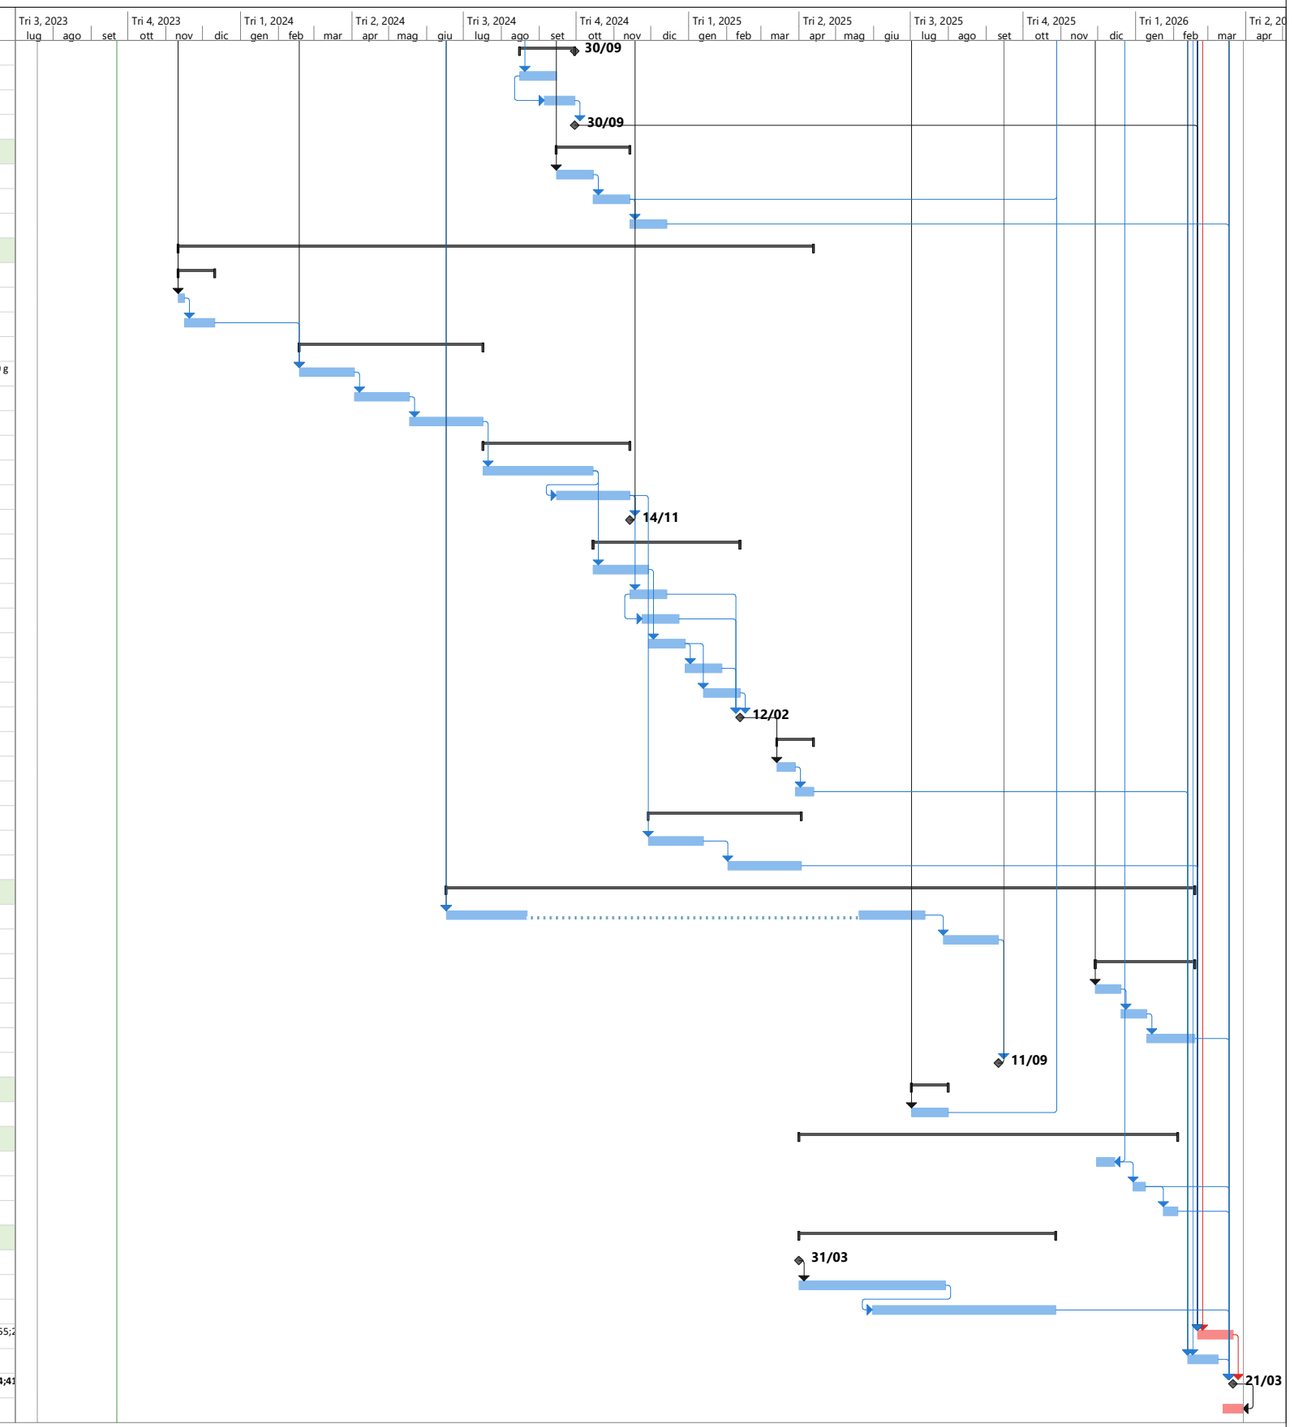

Progetto: Lavori di Completamento della Diga di Pietrarossa in territorio dei Comuni di Aidone (EN) e Mineo (CT)

Attività		Riepilogo		Cardine inattiva		Solo-durata		Solo inizio		Cardine esterno		Divisione critica	
Divisione		Riepilogo progetto		Riepilogo inattiva		Riporto riepilogo manuale		Solo-fine		Scadenza		Avanzamento	
Cardine		Attività inattiva		Attività manuale		Riepilogo manuale		Attività esterne		Critica		Avanzamento manuale	

PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

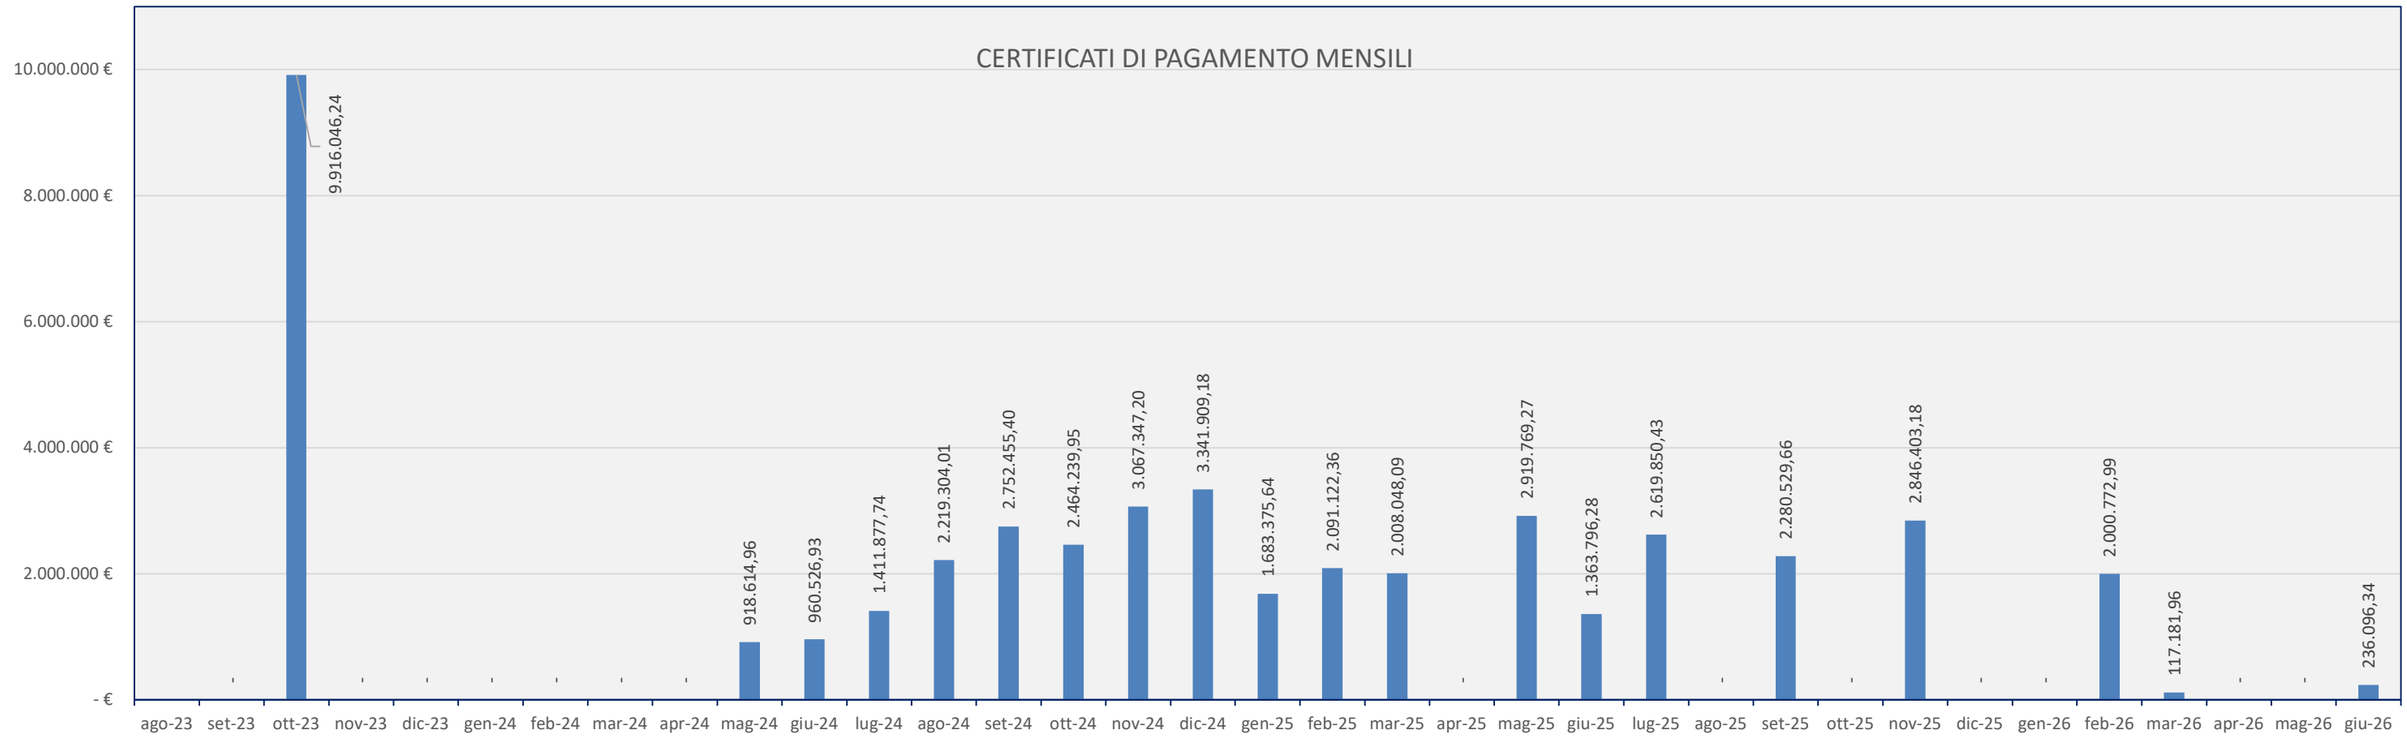

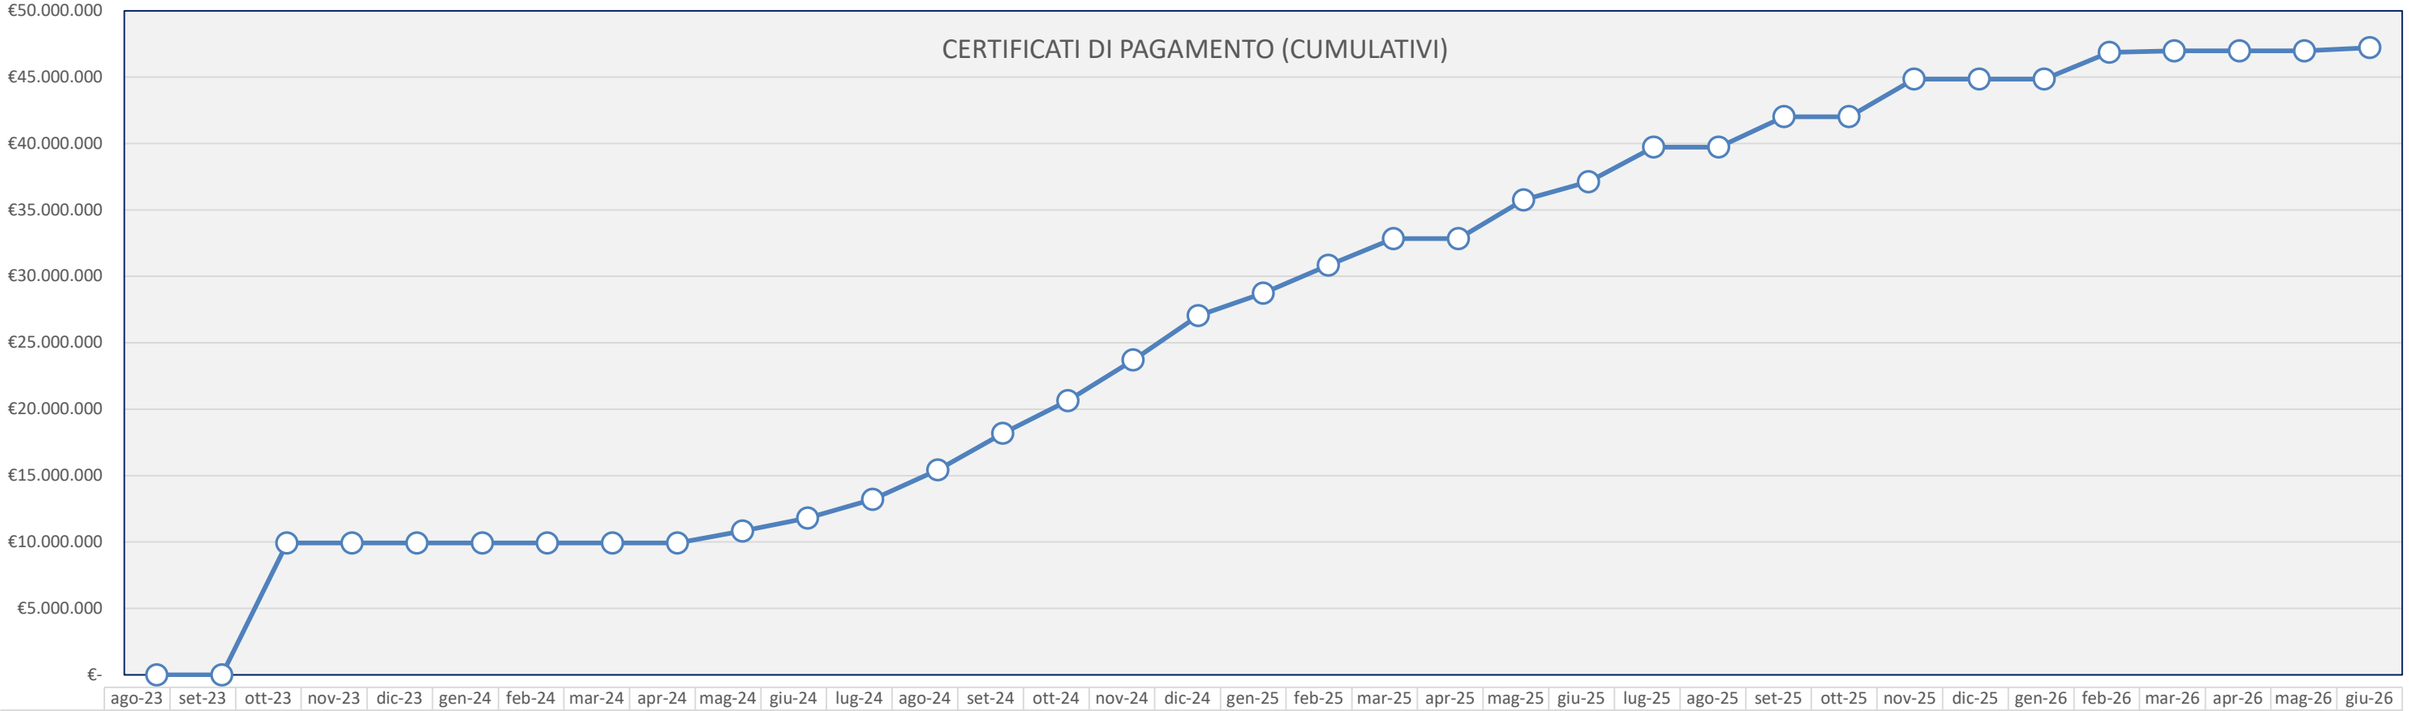

	ago-23	set-23	ott-23	nov-23	dic-23	gen-24	feb-24	mar-24	apr-24	mag-24	giu-24	lug-24	ago-24	set-24	ott-24	nov-24	dic-24	gen-25	feb-25	mar-25	apr-25	mag-25	giu-25	lug-25	ago-25	set-25	ott-25	nov-25	dic-25	gen-26	feb-26	mar-26	apr-26	mag-26	giu-26
Serie1	-	-	9.916.	9.916.	9.916.	9.916.	9.916.	9.916.	9.916.	10.834	11.795	13.207	15.426	18.178	20.643	23.710	27.052	28.735	30.826	32.834	32.834	35.754	37.118	39.738	39.738	42.018	42.018	44.865	44.865	44.865	46.865	46.983	46.983	46.983	47.219
